




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



INFORME DE MEDIO TERMINO

CONVENIO PTR DGA 004/2020, PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APÓSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

Fecha: desde diciembre 22 diciembre 2020- hasta 08 septiembre 2022

Número correlativo de informe: 1

Dirección: 1º Avenida Norte, Bo. Concepción Uluazapa, Departamento de San Miguel

Párroco: Pbro. Wilfredo Alexis Arias Vásquez

Facilitador Institucional institución beneficiada: Arq. Brigido Alberto Gomez Diaz

Fuente de financiamiento: Ministerio de Cultura, Programa de Transferencia de Recurso.

Generalidades: El proyecto forma parte del convenio PTR DGA 004/2020 entre el Ministerio de Cultura y La Parroquia San Pedro Apóstol de Uluazapa, perteneciente a la Diócesis de San Miguel. Compuesto por doce metas que se ejecutaran con fondos transferidos del Ministerio PTR por un monto \$ 90,000.00, los cuales el primer desembolso se recibió mediante cheque No. 0001395 por un monto de \$60,000.00 el 6/12/2021. Y una contrapartida por parte de la Parroquia por una suma de \$27,371.40 totalizando \$117,371.40. Para esto ha sido necesario la preparación de una serie de documentación técnica y administrativa requerida por las instituciones involucradas, leyes y reglamentos inmersos en el proceso de elaboración de documentación previa a la ejecución del proyecto.


Fechas de procesos:

- Firma de convenio PTR DGA 004/2020: 22/12/2020 Ministerio de Cultura y Parroquia San Pedro Apóstol Uluazapa.
- Autorización de los planos para la realización de obras 18/11/2021, según resolución *DBCIGU 183-2021 de fecha 19 de noviembre 2021*
- Resolución modificativa uno al convenio 25/11/2021
- Resolución modificativa dos al convenio 21/01/2022

RECIBO
7-10-22
11:09 A.M.



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



- Resolución modificativa tres al convenio 21/04/2022
- Resolución modificativa cuatro al convenio 29/07/22
- Presentación de ofertas 22/04/22.
- Adjudicación de obras de restauración 11/07/22.
- Inicio de obras de restauración 28/07/22.

Las Actividades a realizarse con los fondos asignados por el Ministerio de Cultura, serán ejecutados de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ante esto, se prepararon las bases de competencia e invito a una licitación pública a las empresas quienes mostraron interés en el proceso hasta su adjudicación del cual se desglosa las fechas siguientes.

- **Invitación a ofertar a empresas y personas naturales. 29/03/2022**

Mediante el Sistema de compras del estado (COMPRASAL) y medio escrito de circulación nacional (Periódico El Salvador)

- **Retiro de bases de competencia. 29 y 30 /03/ 2022**

Retiraron bases de licitación un total de trece empresas mediante COMPRASAL y en la Oficina Parroquial dos empresas haciendo un total de quince empresas.

- **Recepción de ofertas y montos de las mismas.22/04/2022.**

CONSTRUCTORA DE ORIENTE S.A DE C.V.\$ 89,999.95.

MP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V \$89 615.77

- **Ratificación de resultado de comisión evaluadora y notificación. 11/07/22**

La comisión evaluadora en base a sus competencias y análisis recomendó a la empresa MP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V por un monto de \$89, 615.77 como ganadora, la cual fue ratificada mediante reunión de consejo Económico Parroquial.

- **Publicación de resultados COMPRASAL 19/07/22**

- **Publicación de resultados Periódico el Salvador 21/07/22**

Ambas publicaciones se realizaron en base al artículo 57 de la LACAP, con diferencia de fechas debido a la disponibilidad de espacio del medio escrito.



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
 ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



- **Firma de contrato de ejecución de obras de restauración 26/07/22.**
- **Orden de inicio de proyecto. 29/07/22.**

Se notifico a la empresa encargada de la ejecución de obras como a la delegada de supervisión el día de inicio como el tiempo contractual el cual constara de 90 días calendario finalizando el 26 de octubre de 2022.


Otros aspectos relevantes

Es conveniente mencionar que el día el 25 de julio de 2022 se solicito una prorroga de tiempo para el desarrollo de actividades de restauración ya que el plazo del convenio vence el día 06 de octubre de 2022, en dicha nota se aclaran los motivos y se espera la ratificación que anexaría un plazo hasta el 20 de noviembre de 2022, tiempo prudencial ante la presentación de cualquier eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor.


SEGUIMIENTO Y AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA.

(SE INDICAN ÚNICAMENTE ACTIVIDADES INTERVENIDAS HASTA EL 08 DE AGOSTO 2022)


META	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL PERIODO	COMENTARIOS
1	Reparar 287.70 M2 de la estructura de soporte y cubierta del techo en la nave principal, presbiterio y capilla a Jesús de Nazareno, para evitar que continúe el deterioro y colapse; en el periodo de enero a febrero 2022. y agosto a octubre del año 2022.			
	Actividad 1. Desmontar la cubierta de techo de tejas de arcillas de la nave principal de un área de 287.70 M2.	100%	100%	Actividad realizada entre la última semana de enero y primera de febrero de 2022




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 31. Restaurar la losa del techo con bóveda en capilla de Jesús Nazareno como suma global (s g).	100%	0%	No se presenta avance porque está proyectada para el mes de octubre
3	Reparar los elementos funcionales y decorativos compuesto por 8 pedestales de columnas distribuidas en la nave principal como soporte de columnas, 8 columnas de madera que soportan el techo de la iglesia, cambiar 4 metros lineales de viga cargadero (dintel) en puerta de acceso principal, 1 puerta de acceso principal y 2 de los costados respectivos, y así poder evitar el deterioro definitivo de todos estos elementos; en el periodo de agosto a octubre del año 2022.			
	Actividad 5. Restaurar una puerta de madera en acceso principal (<u>2.11M, ancho 3.29M altura</u>)	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 6. Restaurar las 2 puertas de madera de acceso de costado sur y norte (<u>2.0 M, ancho 3.0 m altura</u>).	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
4	Reparar 54.50 M2 de paredes internas y arco de presbiterio del templo parroquial, para evitar el desprendimiento y prolongación de fisuras de repello; más la aplicación de 588.71 M2 de pintura en las áreas externas e internas del templo parroquial, para sellar fisuras, evitar la aparición de hongos; en el mes de julio a octubre del año 2021.			
	Actividad 1. Demoler, limpiar y desalojar el azulejo en mal estado en 20 M2 de paredes en arco de presbiterio del templo parroquial.	100%	67%	Esta Actividad no se ha concluido porque finaliza la segunda semana de agosto




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 2. Limpieza y repello con mortero 1:3 con arena de borda colada 1/6" cal hidratada en fisura y paredes en 54.50 M2 de paredes internas del templo parroquial.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de septiembre
	Actividad 3. Afinado en fisuras interiores con mortero a base de arena de borda colada pase malla 1/64" y cal hidratada dosificación 1:1; 54.50 M2 de paredes internas del templo parroquial.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 4. Aplicación de pintura, incluye Limpieza y preparación de superficie de paredes externas e internas en 588.71 M2.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
5	Sustituir 100 ML de cableado eléctrico, instalar el sistema de 12 luminarias, 3 toma corrientes y 1 tablero general, para adecuar la instalación eléctrica y colocación de montajes modernos; en el periodo de julio a octubre del año 2022.			
	Actividad 1. Desmontaje de las instalaciones eléctricas por suma global (SG).	100%	22%	Actividad programada para los meses de julio a septiembre, al 08 de agosto presenta un avance al 22.22% del 100%
	Actividad 2. Instalar 1 tablero 1f 24esp 4h 120/240v c/barra 125a; montajes empedrados, MAIN de 90am/2polo	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 3. Instalación de 100 ML de cableado eléctrico para luminaria 1#12 + 2#14 THHN en canalización con tubo Conduit galvanizado 3/4"	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 4. Suministro e instalación de 3 interruptores eléctricos.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 5. Instalación de 5 luminarias colgantes tipo candelabro de 12 luces en la estructura de cielo falso de nave principal.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 6. Instalación de 5 luminarias colgantes tipo candelabro de 5 luces en la estructura de cielo falso de nave principal	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
	Actividad 7. Instalación de 2 luminarias de pared tipo farol 1 luz en las paredes de arcos de presbiterios	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para el mes de octubre
6	Desalojar y limpiar mediante suma global (SG) los sitios del proyecto durante el desarrollo de las obras de restauración de la iglesia parroquial, en el periodo de agosto a octubre del año 2022.			
	Actividad 1 Desalojar y limpiar los sitios del proyecto durante el desarrollo de las obras de restauración de la iglesia parroquial más su disposición final de materiales sobrantes a sitios adecuados, estos serán medidos mediante suma global (SG)	100%	9%	Para esta actividad únicamente se han acopiado los materiales desinstalados, los cuales están siendo evaluados para su reparación o desalojo
7	Adquirir 1 rotulo de identificación general del proyecto y 10 rótulos de señalización, para garantizar las rutas evacuación, puntos seguros, etc, en caso de emergencia y salvaguardar la vida del personal involucrado en las obras de restauración, en el mes de agosto del año 2022.			
	Actividad 1. Suministro e instalación de 1 rotulo de identificación general del proyecto donde se desarrollen las obras de restauración de la iglesia parroquial.	100%	100%	Esta actividad ya ha sido suministrada en la semana número uno de agosto




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 2. Suministro de 10 rótulos de señalización de espacios y zonas seguras dentro de las instalaciones donde se desarrollen las obras de restauración de la iglesia parroquial.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para la tercera semana de agosto
8	Adecuar 128 metros cuadrados de instalaciones provisionales de una bodega para el resguardo de materiales, herramientas y equipo de trabajo y una oficina administrativa para el funcionamiento del proyecto; en el periodo de julio a agosto del año 2022.			
	Actividad 1. Adecuar 1 bodega provisional y 1 oficina administrativa con capacidad de 128 metros cuadrados, por las obras de restauración del proyecto.	100%	100%	Esta Actividad se realizó antes del tiempo programado
9	Tramitar los 2 permisos de obra en la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Cultura, para la obtención de las autorizaciones correspondientes y publicaciones por convocatoria y resultados del proceso de licitación, para la realización de las obras de restauración de la iglesia, en los meses enero de 2022 y julio del año 2022.			
	Actividad 1. Tramitar el permiso ante la Alcaldía Municipal correspondiente, para la autorización de Obras de restauración de la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.	100%	100%	Por tratarse de la aprobación de permisos previos a las intervenciones de la iglesia, estas actividades se realizaron en el mes de enero de 2022
	Actividad 2. Tramitar el permiso ante el Ministerio de Cultura correspondiente, para la autorización de Obras de restauración de la iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.	100%	100%	Los permisos se realizaron en septiembre y octubre de 2021




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 3. Realizar la publicación para la invitación en un medio de comunicación escrito, por la realización de las obras de restauración de la iglesia San Pedro Apóstol.	100%	100%	Actividad realizada en el mes de marzo de 2022
	Actividad 4. Realizar la publicación por los resultados de la Licitación a través de un medio de comunicación escrito, por la realización de las obras de restauración de la iglesia San Pedro Apóstol.	100%	100%	Actividad realizada en el mes de julio de 2022
10	Contratar 4 auxiliares de obra para instalar y desinstalar elementos de protección contra el polvo y humedad para elementos fijos tales como: retablos del presbiterio, capilla del santísimo y capilla de Nazareno. más el suministro de equipo, herramientas y materiales necesarios en el mes de julio a octubre del año 2022.			
	Actividad 1. Contratar 4 auxiliares de obra para un periodo de 2 jornadas para montar y desmontar elementos de protección para retablo de presbiterio, retablo de capilla del santísimo, retablo de capillas a Nazareno.	100%	66%	Estas actividades se iniciaron en el mes de julio y se retomaron en el mes de octubre
	Actividad 2. Alquiler de andamios para colocación de plásticos y mallas de protección contra el polvo (9 juegos de andamios, 100 yardas de plástico, 80 metros de pita nylon trenzada 1/4", 3 chalecos reflectivos, 3 cascos de protección 6 pares de guantes)	100%	66%	
11	Contratar 2 personas por servicios profesionales, para la elaboración de la carpeta técnica y supervisión del proyecto, para la realización de las obras de restauración; en el periodo de julio a octubre del año 2022.			
	Actividad 1. Contratar por servicios profesionales de un Arquitecto, para la elaboración de la carpeta técnica del proyecto, para las obras de restauración.	100%	100%	Actividad se realizó en el mes de septiembre y octubre de 2021




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



	Actividad 2. Contratar por servicios profesionales un supervisor de obra, para las obras de restauración.	100%	15%	La contratación del profesional de supervisión tendrá vigencia desde la última semana de julio hasta el mes de octubre
12	Contratar 1 persona por servicios profesionales para la gestión contable, durante ejecución del proyecto; en el periodo de septiembre a octubre del año 2022.			
	Actividad 1. Contratar por servicios profesionales un Contador, para el control y registros de todas las operaciones contables del proyecto, por las obras de restauración.	100%	0%	No se ha iniciado esta Actividad por estar programada para los meses de septiembre y octubre



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL




SEGUIMIENTO Y AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES CON
FONDOS DEL MINISTERIO DE CULTURA.

(SE INDICAN ÚNICAMENTE ACTIVIDADES INTERVENIDAS HASTA EL 08 DE AGOSTO 2022)

META	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUTADO DEL PERIODO	COMENTARIOS
1	Reparar 287.70 M2 de la estructura de soporte y cubierta del techo en la nave principal, presbiterio y capilla a Jesús de Nazareno, para evitar que continúe el deterioro y colapso; en el periodo de enero a febrero 2022. y agosto a octubre del año 2022.	100%	0%	Las actividades de la 2 a la 30 de esta meta están programadas para iniciar en la última semana de agosto finalizando en octubre.
2	Reparar 177.21 M2 de cielo falso, 39 ML de fascia de madera en aleros y 50 canecillos en aleros de madera, distribuidos en las áreas de nave principal y presbiterio, para evitar las filtraciones de agua lluvia y restituir las piezas de cielo falso dañadas; en el periodo de agosto a octubre del año 2022.			Las actividades 1,2 y 5 han iniciado durante la primera semana de agosto, el resto de actividades se desarrollarán en los periodos después de la segunda semana de agosto prolongándose hasta septiembre y octubre 2022
	Actividad 1. Desmotar 226.50 ML de listones de madera que soportan las piezas de cielo falso de la nave principal.	100%	20%	Actividad programada para los meses de agosto y septiembre, al 08 de agosto presenta un avance al 20% del 100%




PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL




	Actividad 2. Desmontar las piezas de cielo falso de madera en la nave principal de un área de 177.21 M2.	100%	30.00%	Esta actividad según la programación se iniciaría la tercera semana de agosto, pero, dio comienzo paralelamente al desmontaje de listones de madera, por ello presenta a la fecha un avance de 30% real
	Actividad 5. Desmontar 50 canecillos de madera que de alero de techo de ambos costados	100%	20%	Esta actividad inicio la semana 1 de agosto, al 08 de agosto presenta un avance al 20% del 100%
3	Reparar los elementos funcionales y decorativos compuesto por 8 pedestales de columnas distribuidas en la nave principal como soporte de columnas, 8 columnas de madera que soportan el techo de la iglesia, cambiar 4 metros lineales de viga cargadero (dintel) en puerta de acceso principal, 1 puerta de acceso principal y 2 de los costados respectivos, y así poder evitar el deterioro definitivo de todos estos elementos; en el periodo de agosto a octubre del año 2022.			Las Actividades de la 1 a la 4 no han iniciado en este periodo, por estar programada su ejecución desde la segunda semana de agosto 2022




Arq. Brigido Alberto Gomez Diaz
Facilitador institucional
Parroquia San Pedro Apóstol Uluazapa



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL




Uluazapa 08 de agosto de 2022


ANEXO FOTOGRAFICO





Desmontaje de cubierta de techo compuesta por teja de barro.

Esta actividad se realizó con mano de obra local y parte de la feligresía de la parroquial como parte de las actividades que se incluyen dentro de la contrapartida de la parroquial. La cual consistió en el desmontaje de tejas de barro iniciando el 29 de enero y finalizando el 6 de febrero del año 2022. Durante el resto del año 2021 e inicio del 2022 se le dio mantenimiento a la laminas para garantizar su fijación y la no filtración de agua durante la época lluviosa.

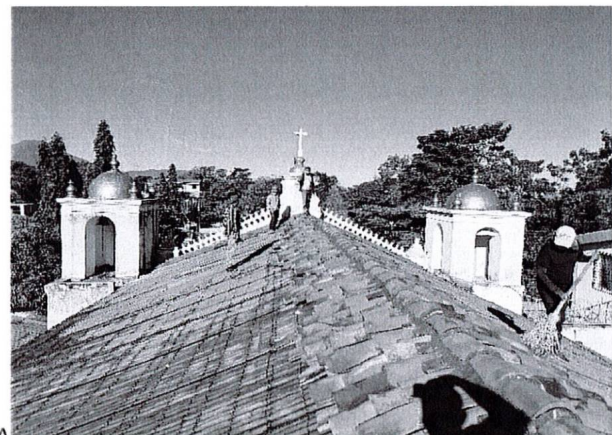



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL

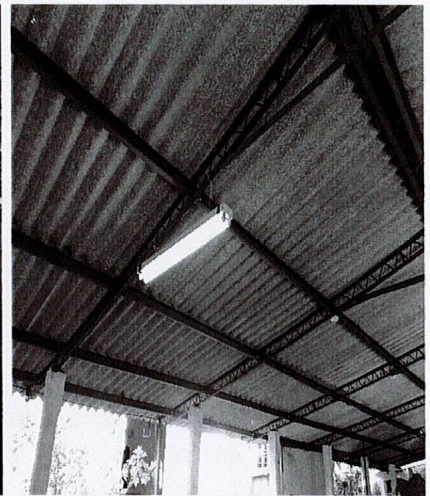


Adecuación de bodega. Para esta actividad se realizó el acomodamiento de instalaciones eléctricas para tomas corrientes, luminarias, el desalojo de mobiliario y otros elementos dentro del salón parroquial con el fin de proveer un espacio techado y con las condiciones necesarias para el funcionamiento de bodega de materiales, herramientas y area de descanso para obreros.



Adecuación de oficina del proyecto. También se realizó la adecuación de paredes, techo, instalaciones eléctricas necesarias para proporcionar el espacio adecuado para oficina provisional de la empresa ejecutora del proyecto.





PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL



Desmontaje de instalaciones eléctricas. Esta actividad se realizó en la primera quincena del mes de julio. El cual consistió en el desmontaje de luminarias, toma corrientes, ventiladores y red de cableado.

Rotulo de identificación de proyecto. Se suministro el rotulo de información del nombre del proyecto y su fuente de financiamiento.

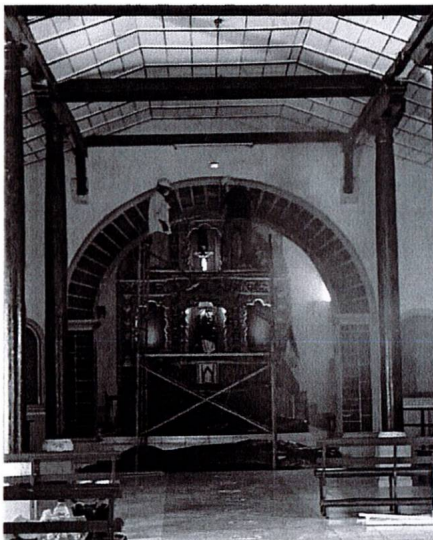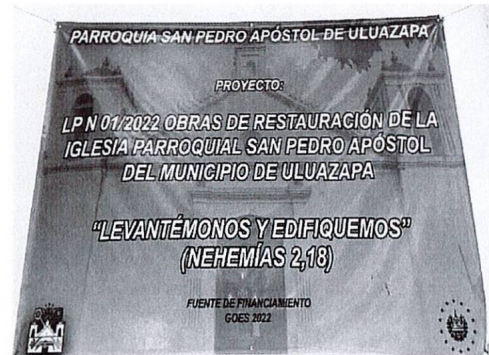



Desmontaje de azulejo en arco de presbiterio. Esta actividad se realizó en la última quincena de julio consistió en el desprendimiento de piezas de azulejo en arco.



Protección de retablo. Para esta actividad ha sido necesario el suministro de material y mano de obra para la instalación de elementos de protección.



PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
ULUAZAPA, DIOCESIS DE SAN MIGUEL

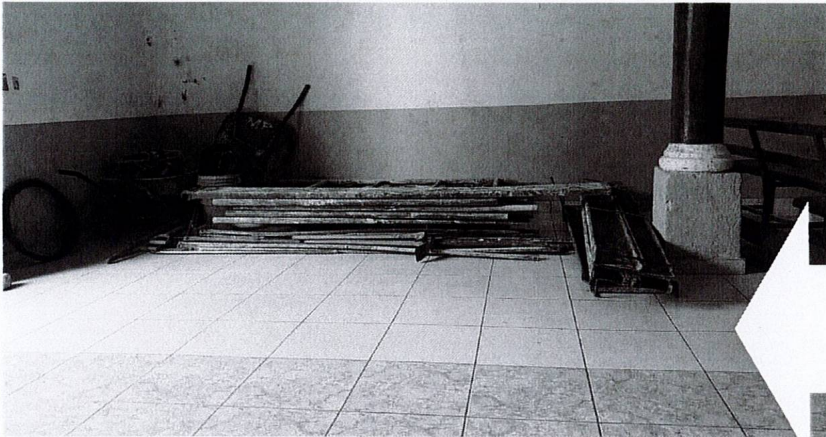

Movilización de equipo. La empresa constructora movilizó equipo, herramientas entre otros elementos el día 29 de julio, esto como parte de las primeras actividades antecesoras al proyecto en general.



Es indispensable la utilización de equipos de seguridad en buen estado dado la naturaleza del proyecto para esto se contará con un plan de seguridad que será garantizado por la empresa verificado por la supervisión.

Desmontaje de canecillos. Esta actividad se realizó durante la primera semana de agosto.



Desmontaje de cielo falso. Esta actividad se desarrolla primeramente desmontando los elementos de soporte de manera inversa al proceso constructivo. Es decir, con la desinstalación de listones de madera. Para luego dar paso al desmontaje de piezas de madera de cielo falso. Las piezas desmontadas se están acopiando para su posterior evaluación de daños y saber si serán reutilizadas o descartadas.



MINISTERIO
DE CULTURA

INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION



Parroquia San Pedro Apóstol
Uluazapa

INSTITUCION BENEFICIADA: PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL, ULUAZAPA

NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APOSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

PERIODO: Diciembre/2021-Noviembre/2022 AÑO : 2022

DESEMBOLSO: Primero

MONTO US\$: \$ 60,000.00

No. de Meta	No. de Correlativo	Fecha de Factura	N.º de Factura	No. de Cheque	Gastos Especificos		Presupuesto US\$		
					Descripción del gasto	Proveedor	Programado	Ejecutado	Saldo
Meta 1					Reparar 287.70 M2 de la estructura de soporte y cubierta del techo en la nave principal, presbiterio y capilla a Jesús de Nazareno, para evitar que continúe el deterioro y colapso; en el periodo de enero a febrero 2022 y agosto a diciembre del año 2022.		\$ 45,998.81	\$ 38,915.20	\$ 7,083.61
Actividad 2.		Desmontar y sustitución del capote de techo de tejas de arcillas de la nave principal de una longitud de 41.50 ML.							
	1	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de 41.50 ml de capote de techo	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 58.52	\$ 58.52	\$ -
Actividad 3.		Desmontar el alambre de púas sobre la lámina de la nave principal de un área de 287.70 M2.							
	2	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de alambre de puas un área de cubierta de techo de 287.70 M2.	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 405.66	\$ 405.66	\$ -
Actividad 4.		Desmontar y reparar la cubierta de lámina acanalada de la nave principal de un área de 287.70 M2.							
	3	25/11/2022	0091	003	Desmontaje y reparacion de cubierta de lamina en nave principal de un área de 287.70 M2.	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 405.66	\$ 405.66	\$ -
Actividad 5.		Desmontar las correas de madera 1x1" de la estructura de techo en una longitud de 1942.20 ML							
	4	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de correas de madera en mal estado de la estructura de techo en una longitud de 1942.20 ML	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 2,738.50	\$ 2,738.50	\$ -
Actividad 6.		Desmontar las viguetas de 2x2" de madera de la estructura de techo de nave principal en una longitud de 334.80 ML.							
	5	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de viguetas de madera de 2x2" en mal estado de la estructura de techo, longitud de 334.80 ML	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 472.07	\$ 472.07	\$ -
Actividad 9.		Desmontar las vigas tensor de madera en naves laterales 4"x5" longitud de 17.40 ML							
	6	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de vigas tensor de madera en naves laterales 4"x5" longitud de 17.40 ML	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 86.13	\$ 86.13	\$ -



MINISTERIO
DE CULTURA

INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION



Parroquia San Pedro Apóstol
Uluazapa

INSTITUCION BENEFICIADA: PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL, ULUAZAPA

NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APOSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

PERIODO: Diciembre/2021-Noviembre/2022 AÑO : 2022

DESEMBOLSO: Primero

MONTO US\$: \$ 60,000.00

No. de Meta	No. de Correlativo	Fecha de Factura	N.º de Factura	No. de Cheque	Gastos Específicos		Presupuesto US\$		
					Descripción del gasto	Proveedor	Programado	Ejecutado	Saldo
Actividad 11. ✓	Desmontar la viga de madera en cumbrera (medidas promedio 4"x4") de la estructura de techo de nave principal, longitud 21.45 ML. ✓								
	7	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de viga de madera en cumbrera de 4"x4" en la estructura de techo de nave principal, longitud 21.45 ML. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 212.14	\$ 212.14	\$ -
Actividad 13. ✓	Restaurar las 8 unidades de vigas zapata (cargadero) ✓								
	8	25/11/2022	0091	003	Restauración de 8 vigas zapatas. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ -
Actividad 15. ✓	Restaurar la viga de madera compuesta (v3) en la estructura de techo, longitud 42.74 ML. ✓								
	9	25/11/2022	0091	003	Restauración de vigas de madera compuesta (v3) en la estructura de techo, longitud 42.74 ML. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 3,054.75	\$ 3,018.73	\$ 36.02
Actividad 17. ✓	Restaurar la viga tensor en estructura de techo, longitud 43.50 ML. ✓								
	10	25/11/2022	0091	003	Restauración de viga tensor en la estructura de techo, 43.50 ML. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 1,535.99	\$ 1,535.99	\$ -
Actividad 18. ✓	Reinstalación de viga tensor en estructura de techo, longitud 17.40 ML. ✓								
	11	25/11/2022	0091	003	Reinstalación de 17.40 ML. de viga tensor en estructura de techo. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 245.86	\$ 245.86	\$ -
Actividad 19. ✓	Restaurar las vigas de madera en nave central en piernas o pares de cerchas 4"x5". En la estructura de techo de nave central, longitud 203.5 ML. ✓								
	12	25/11/2022	0091	003	Restauración de 203.5 ML. de las vigas de madera en nave central en piernas o pares de cerchas 4"x5". ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 4,312.17	\$ 4,312.17	\$ -
Actividad 21. ✓	Restaurar las vigas de madera en naves laterales 4"x5". En la estructura de techo de nave central, longitud 137.50 ML. ✓								
	13	25/11/2022	0091	003	Restauración de vigas de madera en naves laterales medidas de 4"x5". En la estructura de techo de nave central, longitud 137.50 ML. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 3,884.38	\$ 3,884.38	\$ -
Actividad 24. ✓	Restauración y reinstalación de viguetas de madera de 2"x2". de estructura de techo, longitud 267.19 ML. ✓								
	14	25/11/2022	0091	003	Restauración y reinstalación de viguetas de madera de 2"x2". En la estructura de techo, 267.19 ML. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 2,642.51	\$ 2,642.51	\$ -



MINISTERIO
DE CULTURA

INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION



Parroquia San Pedro Apóstol
Uluazapa

INSTITUCION BENEFICIADA: PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL, ULUAZAPA

NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APOSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

PERIODO: Diciembre/2021-Noviembre/2022 AÑO : 2022

DESEMBOLSO: Primero

MONTO US\$: \$ 60,000.00

No. de Meta	No. de Correlativo	Fecha de Factura	N.º de Factura	No. de Cheque	Gastos Específicos		Presupuesto US\$		
					Descripción del gasto	Proveedor	Programado	Ejecutado	Saldo
Actividad 25.	Suministro e instalación de viguetas de madera de 2"x2" en estructura de techo, longitud 89.06 ML ✓								
	15	25/11/2022	0091	003	Suministro e instalación de viguetas de 2"x2" en estructura de techo longitud 89.06 ML	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 880.80	\$ 880.80	\$ -
Actividad 26.	Restauración y reinstalación de correas de madera de 1"x1" de estructura de techo, longitud 943.80 ML ✓								
	16	25/11/2022	0091	003	Restauración y reinstalación de correas de madera de 1"x1" en la estructura de soporte de cubierta de techo con logitud de 943.80 ML.	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 4,803.94	\$ 4,803.94	\$ -
Actividad 27.	Suministro e instalación de correas de madera de cedro o similar de 1"x1 de estructura de techo de nave principal, longitud de 314.60 ML. ✓								
	17	25/11/2022	0091	003	Suministro e instalación de 314.60 ML. de correas de madera de cedro de 1"x1 en estructura de techo de nave principal.	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 2,110.97	\$ 2,110.97	\$ -
Actividad 28.	Restauración y montaje de lámina galvanizada canal sencillo, dos manos de galvite en 1 cara, sobre la estructura de techo. área de 279.50 M2. ✓								
	18	25/11/2022	0091	003	Restauración y montaje de lámina galvanizada canal sencillo, suministro de dos manos de pintura tipo galvite en 1 cara, área de 279.50 M2. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 2,370.16	\$ 2,370.16	\$ -
Actividad 29.	Suministro y colocación de malla tipo gallinero sobre la superficie de lámina galvanizada en estructura de techo. en un área de 279.50 M2. ✓								
	19	25/11/2022	0091	003	Suministro y colocación de malla tipo gallinero sobre cubierta de lámina galvanizada en un área de 195.65 M2. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 1,383.53	\$ 968.47	\$ 415.06
Actividad 30.	Instalación de teja de arcilla (árabe) en cubierta de techo en un área de 279.50 M2. ✓								
	20	25/11/2022	0091	003	Instalación de teja de arcilla para cubierta de techo en un área de 139.75 M2. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 13,265.07	\$ 6,632.54	\$ 6,632.53
Meta 2	Reparar 177.21 M2 de cielo falso, 39 ML de fascia de madera en aleros y 50 canecillos en aleros de madera, distribuidos en las áreas de nave principal y presbiterio, para evitar las filtraciones de agua lluvia y restituir las piezas de cielo falso dañadas; en el periodo de agosto a diciembre del año 2022.						\$ 4,481.98	\$ 2,137.15	\$ 2,344.83
Actividad 1.	Desmotar 226.50 ML de listones de madera que soportan las piezas de cielo falso de la nave principal.								
	21	25/11/2022	0091	003	Desmotar 226.50 ML de listones de madera que sirven de cargaderos de las piezas de cielo falso dentro de la nave principal.	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 240.09	\$ 240.09	\$ -



MINISTERIO
DE CULTURA

INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION



Parroquia San Pedro Apóstol
Uluazapa

INSTITUCION BENEFICIADA: PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL, ULUAZAPA

NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APOSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

PERIODO: Diciembre/2021-Noviembre/2022 AÑO : 2022

DESEMBOLSO: Primero

MONTO US\$: \$ 60,000.00

No. de Meta	No. de Correlativo	Fecha de Factura	N.º de Factura	No. de Cheque	Gastos Específicos		Presupuesto US\$		
					Descripción del gasto	Proveedor	Programado	Ejecutado	Saldo
Actividad 2. ✓	Desmontar las piezas de cielo falso de madera en la nave principal de un área de 177.21 M2. ✓								
	22	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de piezas de cielo falso de madera dentro de la nave principal para una área de 177.21 M2. ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 187.84	\$ 187.84	\$ -
Actividad 5. ✓	Desmontar 20 canecillos de madera que de alero de techo de ambos costados ✓								
	23	25/11/2022	0091	003	Desmontaje de 20 canecillos de madera que de alero de techo de ambos costados de la iglesia ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 56.60	\$ 56.60	\$ -
Actividad 6. ✓	Instalar 20 canecillos de madera en aleros de techo de ambos costados. ✓								
	24						\$ 692.20	\$ -	\$ 692.20
Actividad 7. ✓	Desmontar, reparar e instalar 39 ML de viga sobre canecillos en alero de techos ✓								
	25	25/11/2022	0091	003	✓Desmontaje, reparación e instalación de 19.50 ML de viga sobre canecillos en alero de techos	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 1,928.16	\$ 964.08	\$ 964.08
Actividad 8. ✓	Desmontar, reparar e instalar 39 ML de fascia en alero de techos ✓								
	26	25/11/2022	0091	003	Desmontaje, reparación e instalación de 19.50 ML de fascia en alero de techos ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 1,377.09	\$ 688.54	\$ 688.55
Meta 3 ✓	Reparar los elementos funcionales y decorativos compuesto por 8 pedestales de columnas distribuidas en la nave principal como soporte de columnas, 8 columnas de madera que soportan el techo de la iglesia, cambiar 4 metros lineales de viga cargadero (dintel) en puerta de acceso principal, 1 puerta de acceso principal y 2 de los costados respectivos, y así poder evitar el deterioro definitivo de todos estos elementos; en el periodo de agosto a diciembre del año 2022. ✓								
Actividad 1. ✓	Restauración de 8 unidades de pedestal de mampostería de columnas en nave principal. ✓								
	27						\$ 1,130.00	\$ -	\$ 1,130.00
Actividad 2. ✓	Restauración de 8 unidades de columnas de madera en nave principal. ✓								
	28	25/11/2022	0091	003	Restauración de 2 de columnas de madera en nave principal ✓	M.P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 3,955.04	\$ 988.76	\$ 2,966.28
Actividad 3. ✓	Cambio de 4 ML de viga cargadero (dintel) de madera de cedro en puertas con medidas de 8" x6" ✓								
	29						\$ 1,412.52	\$ -	\$ 1,412.52



MINISTERIO
DE CULTURA

INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION



INSTITUCION BENEFICIADA: PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL, ULUAZAPA

NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE RESTAURACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO APOSTOL DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA

PERIODO: Diciembre/2021-Noviembre/2022 AÑO : 2022

DESEMBOLSO: Primero

MONTO US\$: \$ 60,000.00

No. de Meta	No. de Correlativo	Fecha de Factura	N.º de Factura	No. de Cheque	Gastos Específicos		Presupuesto US\$		
					Descripción del gasto	Proveedor	Programado	Ejecutado	Saldo
Actividad 4.					Cambio de 4 ML de viga cargadero (dintel) de madera de cedro en puertas con medidas de 11" x6" ✓				
	30						\$ 1,412.52	\$ -	\$ 1,412.52
Obra complementaria							\$ 1,609.13	\$ -	\$ 1,609.13
ODC -1					Suministro e instalación de cielo falso entablado de madera de cedro de diferentes medidas				
	31						\$ 804.57	\$ -	\$ 804.57
ODC-3					Restauración de canchillos de madera de cedro en fascia y alero de techo				
	33						\$ 804.56	\$ -	\$ 804.56
TOTALES							\$ 60,000.00	\$ 42,041.11	\$ 17,958.89

En revisión de la liquidación se detectó que en la Meta 1, Actividad 15, por error involuntario se programó 43.25 ML, siendo lo correcto 42.74 ML; basados en el documento del proyecto aprobado, se programó 38.39 ML, más un aumento de obra de 4.35 ML en la Orden de Cambio, totalizando 42.74 ML por el costo unitario de \$70.63, equivalente a un monto de \$ 3,018.73 y dado que la empresa cobró \$3,054.75, devolverá \$36.02. Razón por la cual existe un saldo no ejecutado en la Meta 1, Actividad 15.

Uluazapa 2 de diciembre de 2022



Pbro. Wilfredo Alexis Arias Vásquez

Párroco

Parroquia San Pedro Apóstol Uluazapa



Brigido Alberto Gómez Díaz

Facilitador Institucional

Parroquia San Pedro Apóstol Uluazapa



Sandra Noemi Chicas de Velásquez

Tesorera Consejo de Finanzas

Parroquia San Pedro Apóstol Uluazapa
