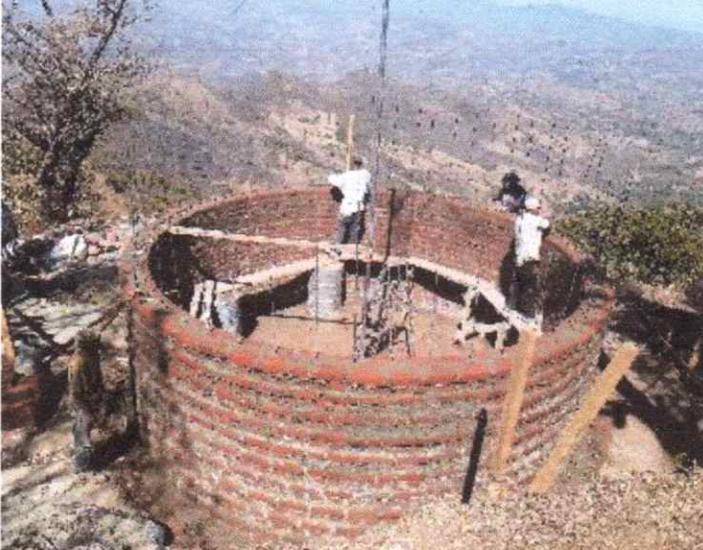


## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION, FEBRERO 2020

	
<p>"CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN CASERIO SAN FELIPE, CANTON SANTA MARTA"</p>	<p>"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO Y BADEN EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CANTON SAN ANTONIO"</p>
<p><b>AVANCE FISICO: 8100%</b></p>	<p><b>AVANCE FISICO: 20 %</b></p>
<p><b>AVANCE FINANCIERO: \$27,901.71</b> Es decir 80.40% de avance financiero</p>	<p><b>AVANCE FINANCIERO: \$5,038.00</b> es decir se lleva gastado 33.59 % de avance financiero</p>
<p><b>AVANCE TIEMPO CONTRACTUAL: 66 días</b></p>	<p><b>AVANCE TIEMPO CONTRACTUAL: 16 días</b></p>

	
<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA</p>	<p>"CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO LAS DANTAS, CANTON SAN PEDRO</p>
<p><b>AVANCE FISICO: 75.00%</b></p>	<p><b>AVANCE FISICO: 17.00% de avance físico</b></p>
<p><b>AVANCE FINANCIERO: \$88,140.59</b> es decir 63.36 % de avance financiero: \$ 3372,52 es decir 48%</p>	<p><b>AVANCE FINANCIERO: \$8,522.00</b> es decir 29.38 % de avance financiero</p>
<p><b>AVANCE TIEMPO CONTRACTUAL: 84 días</b></p>	<p><b>AVANCE TIEMPO CONTRACTUAL: 22 días</b></p>
