

San Salvador, 14 de abril de 2015

**D.E. 016/2015**

Licenciado

**Jerson Rogelio Posada**

Director General de Inversión y Crédito Público  
Ministerio de Hacienda  
Presente.

Estimado Licenciado Posada:

Sirva encontrar anexo el informe de avance físico del "Programa Techo y Agua – Fase 2014", correspondiente al mes de marzo del año 2015.



En este periodo, la Unidad Ejecutora ADESCOPOM finalizó el proceso de recepción e instalación de tanques y las Unidades Ejecutoras Alcaldía de San Pedro-Nonualco, ADESCOBOSTI, ADESCOLOMAS Y ADESCO SAN JOSE LA CUEVA dieron inicio a los proyectos en la fase de construcción de losas y adiciones.

El Programa presenta un avance global del 10.64%, lo que representa un atraso del 0.23% con respecto al 10.87% programado.

Sin otro particular, me permito presentarle las muestras de mi consideración y estima.



*Judith Panameño Hidalgo*  
Lic. Judith Panameño Hidalgo  
Directora Ejecutiva  
FONAES

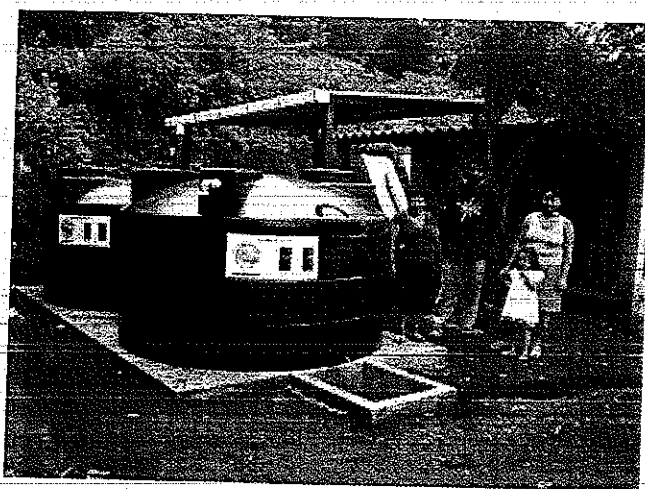
cc:

- Ing. Roberto Rodríguez  
Formulación y Proyectos/FONAES
- Lic. Transito Gómez  
Unidad Financiera/FONAES
- Ing. Sandra de Zaragoza  
DGICP/Ministerio de Hacienda

*Eugenia de Mendez*  
División de Gestión  
de Inversión M H  
15 Apr 2015 8:40 AM



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**  
**FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR**  
**FONDO FRANCO - SALVADOREÑO**



**INFORME FISICO FINANCIERO**

**PROGRAMA TECHO Y AGUA**  
**FASE 2014**

**MARZO 2015**

# FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

## PROGRAMA "TECHO Y AGUA 2014"

AVANCE FISICO GLOBAL DEL PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2015

No.	PROYECTO	% DE AVANCE	CONTRIBUCIÓN AL AVANCE DEL PROGRAMA
1	Caserío Los Martínez y Los Ochoa, Cantón Potrerillos del Matazano, Municipio y Departamento de Santa Ana	74,25	6,67
2	Caserío Talista del Cantón Hacienda Vieja, Municipio de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz	54,05	2,70
3	Caserío Bosques Del Tigre, Cantón El Tigre, Municipio de Santiago de María Departamento De Usulután	9,50	1,06
4	Caseríos Las Lomas, Los Arenales y La Bolsa, Cantón Lomas De San Marcelino, Municipio y Departamento de Santa Ana	1,00	0,08
5	Cantón San Jose La Cueva, Municipio De San Juan Opico y Departamento de La Libertad	1,00	0,12
<b>AVANCE DEL PROGRAMA</b>			<b>10,64</b>

EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA	
AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA - %	10,87
AVANCE REAL %	10,64
ADELANTO Ó ATRASO A LA FECHA - %	(0,23)

