

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2020

Período enero-septiembre año 2020

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL**

Octubre de 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
CAPITULO I	3
<i>RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS</i>	3
RE.1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población.	3
RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local.	7
RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio. ..	9
CAPITULO II	15
<i>RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS</i>	15
RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.	15
CAPITULO III.....	17
<i>RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO</i>	17
RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.	17
CAPITULO IV	18
<i>RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL</i>	18
RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.....	19
CAPITULO V	22
<i>RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE</i>	22
RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.....	22
RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.....	27
RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.....	40
CAPITULO VI	43
<i>RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO</i>	43
ANEXO 1	44
<i>DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</i>	44
ANEXO 2	51
<i>DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS</i>	51

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo de enero a septiembre 2020. La información incluida en este documento pertenece a aquellos proyectos que tenían programado un avance de ejecución durante dicho periodo y se ha realizado con base a los datos brindados por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

El informe se divide en 6 capítulos, los primeros 5 capítulos corresponden a los Resultados Generales (RG) del Plan Operativo 2020 y describen el avance de los Resultados Estratégicos a través de los avances de cada uno de los proyectos que lo conforman. Además se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada proyecto, de la siguiente manera:

Ejecutado entre el 90% - 100% o más	Verde
Ejecutado entre el 75% a menos del 90%	Amarillo
Ejecutado menor al 75%	Rojo

En el capítulo 6 se presenta el resumen de cumplimiento del semestre que se está reportando.


CAPÍTULO I

RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS

RE.1.1 Mejoras las condiciones socio-económicas de la población. (Porcentaje promedio de cumplimiento 87%)

El Resultado Estratégico 1.1, para el año 2020, está compuesto por 4 proyectos de los cuales 3 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 1 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 1. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

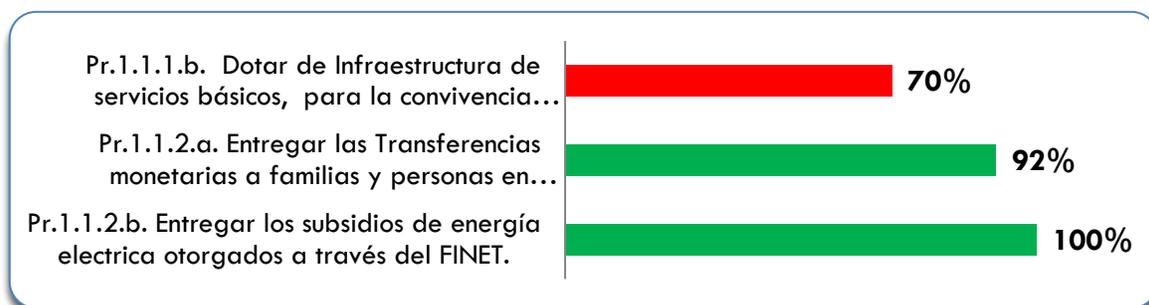

PR.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales

Pr.1.1.1.b. Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural. 70% (GIN)

El proyecto consiste en ejecutar proyectos de infraestructura social, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada, de diversas tipologías de proyectos. Contempla la Planificación y gestión para la construcción, ampliación y/o mejora de sistemas de agua potable y saneamiento, de redes y conexión de servicio de energía eléctrica, infraestructura para la educación, la salud, la convivencia comunitaria, la recreación y esparcimiento entre otros.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
49%	34%	70%

Durante este periodo se finalizaron 28 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Población Beneficiaria
Proyectos de electrificación	552 acometidas (7 proyectos)	10,127
Proyecto de agua potable	122 acometidas (1 proyecto)	610
Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación	53 CE (10 proyectos)	18,623
Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.	4 proyectos	57,388
Equipamiento de Infraestructura Institucional	1 proyecto	1,200
Proyectos de sistemas de saneamiento	134 sistemas individuales (2 proyectos)	720
Mejoramiento de sistemas de agua Potable y Sistemas de Tratamiento	2 proyectos	4,336
Infraestructura deportiva (estadios, gimnasios nacionales, etc.)	1 proyecto	30,850

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

Para este periodo se tenía programado finalizar 12 proyectos más en las siguientes tipologías:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
Proyectos de electrificación	180 acometidas (3 proyectos)	2 proyectos continúan en proceso de conexión por parte de la distribuidora eléctrica. (Teotepeque y Comasagua) 1 proyecto está finalizado y conectado por la distribuidora, finalizará en octubre. (Cuisnahuat)
Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación	38 CE (4 proyectos)	Los proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en octubre, noviembre y diciembre. (Santa Ana (2) Ahuachapán (1) San Francisco Menéndez (1))

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
Equipamiento de Infraestructura Institucional	2 proyectos	Los proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en octubre. (Ahuachapán y Cojutepeque)
Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.	3 proyectos	La recepción del proyecto se hizo a satisfacción hasta octubre, el proyecto ya está finalizado. (El Rosario, La Paz) 2 proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en octubre y diciembre. (Mejicanos y Ahuachapán)

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

Debido a lo anterior el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 40%.

PR.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables

Pr.1.1.2.a. Entregar las Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad. 92% (DRT)

El proyecto consiste en la entrega de Transferencias Monetarias condicionadas y no condicionadas a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de los programas que el FISDL ejecuta y que están contemplados en la Ley de Desarrollo y Protección Social: Bonos Salud/Educación, Pensión al Adulto Mayor, Pensión a personas con discapacidad; además la transferencia a veteranos del Histórico FMLN. Para ello se elaboran las planillas respectivas con las cuales se gestionan los fondos requeridos.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
56%	51%	92%

- Planillas Devengadas

Nº	Concepto	Planillas programadas	Planillas devengadas
1	Transferencias monetarias a adultos mayores	207	210
2	Pensión por discapacidad	58	58
4	Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN	4	4

- **Pago de Transferencias Monetarias**

N°	Concepto	Entregas programadas	Entregas realizadas	Entregas pendientes
1	Transferencias monetarias a adultos mayores	159	83	73
2	Pensión por discapacidad	29	20	9
3	Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN	4	4	-

*El detalle de los municipios a los que se les ha hecho la entrega de transferencias se encuentra en el anexo 2, sección A de este informe

El número de personas atendidas con la entrega de estas transferencias es:

Concepto	Personas atendidas
Transferencias monetarias a adultos mayores	26,227
Pensión por discapacidad	783
Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN	1,115

Los pagos de Transferencias Monetarias de Adulto Mayor y pensión por Discapacidad se han ido realizando en la medida se van recibiendo fondos de parte del Ministerio de Hacienda, y la disponibilidad de los municipios para apoyar la logística del pago a pesar de no contar con personal de Acompañamiento y con las restricciones en el marco de la pandemia (no hay transporte público, cercos sanitarios, etc.). Se hará las gestiones con el Ministerio de Hacienda sobre los fondos requeridos para poder realizar el pago de las transferencias pendientes. Debido a lo anterior el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto 8%.

Pr.1.1.2.b. Entregar los subsidios de energía eléctrica otorgados a través del FINET. 100% (GIN)

El proyecto consiste en la Transferencia de recursos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que subsidian la factura eléctrica residencial con un consumo inferior a 105 KW/H, así como subsidio al consumo de energía eléctrica asociado a proyectos de bombeo y rebombeo de agua, así como el subsidio a la construcción y mejoramiento de la infraestructura para el suministro de energía eléctrica.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
---------------------------	--------------------------	------------------------------------




Durante este periodo se transfirieron recursos para realizar el abono de:

1. 8,387,886 Subsidios al consumo de energía eléctrica residencial. (Cantidad de abonos residenciales).
2. 4,698 subsidios al consumo de energía eléctrica asociado a proyectos de extracción, bombeo y rebombeo de agua. (Cantidad de abonos por bombeo de agua).

RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. (Porcentaje promedio de cumplimiento 87%)

El Resultado Estratégico 1.2, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos de los cuales ambos tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 2. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

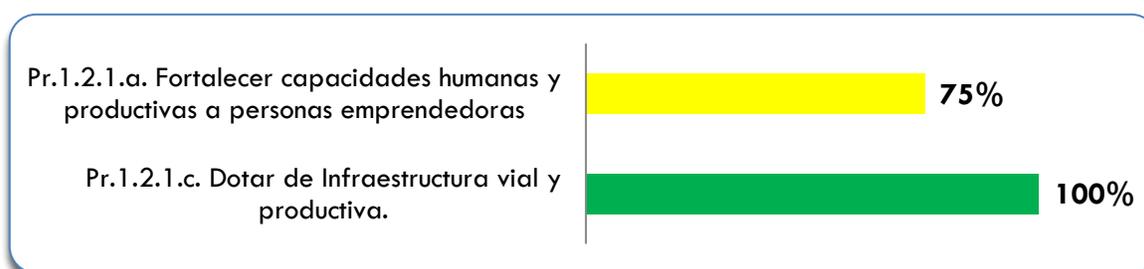

PR.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales

Pr.1.2.1.a. Fortalecer capacidades humanas y productivas a personas emprendedoras. 75% (DDP)

El proyecto consiste en fortalecer a las personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) en su condición humana y productiva a través de procesos de formación, definido en metodologías establecidas por un periodo de 12 meses, donde al final de la intervención las personas quedan con su emprendimiento organizado.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
33%	25%	75%

- **En el marco de la intervención "Inserción Productiva de Migrantes Retornados a El Salvador" del Programa Emprendimiento Solidario PES** se organizaron 38 iniciativas productivas del municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel.
- **En el marco de la "Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP)" del programa Emprendimiento Solidario PES**
 - Se organizaron 76 iniciativas productivas en 3 municipios: San Fernando, Lislique y Guatajiagua.
 - Se capacitaron 430 personas en temas de fortalecimiento de condición humana y productiva, en 8 municipios:
 - El Rosario
 - Caluco
 - San Cristóbal
 - Guaymango
 - Teotepeque
 - Gualococti
 - Jicalapa
 - Torola

Durante el periodo de cuarentena decretado por la emergencia sanitaria por el COVID-19 se suspendió la organización de iniciativas, así como los procesos de formación, en el marco de la EEP. Esto es lo que corresponde al 25% de cumplimiento pendiente de este proyecto.

Pr.1.2.1.c. Dotar de Infraestructura vial y productiva. 100% (GIN)

El proyecto consiste en la ejecución de obras de infraestructura productiva, en áreas de infraestructura vial, comercio, puentes, obras de protección y mitigación, centros de formación técnico-vocacional, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
58%	58%	100%

Se finalizaron 7 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

Tipo de Infraestructura	Cantidad	Población Beneficiaria
Mejoramiento de caminos	2.66 KM (5 proyectos)	23,506

Obras de protección y mitigación	1 proyecto	180
Proyectos que fomentan la producción y comercialización	1 proyecto	15,200


*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección B de este informe.

RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **90%**)

El Resultado Estratégico 1.3, para el año 2020, está compuesto por 7 proyectos de los cuales 4 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 3 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 3. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

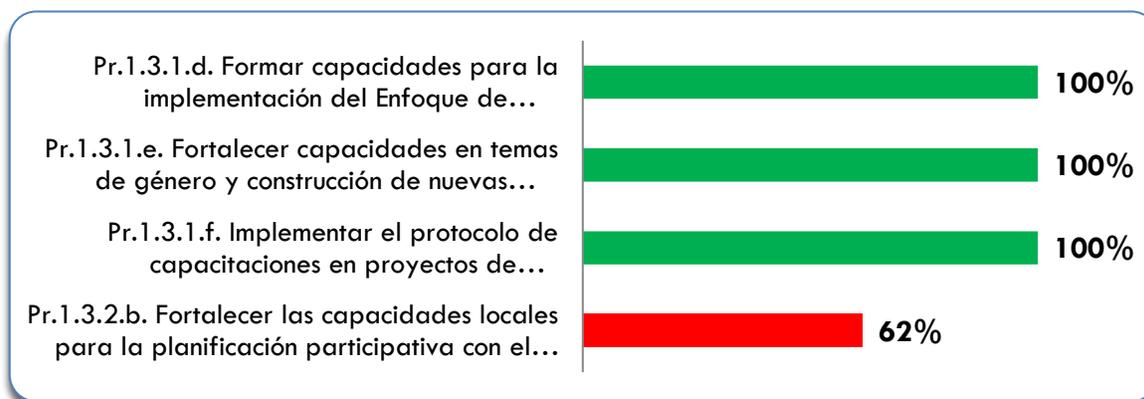

PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local

Pr.1.3.1.d. Formar capacidades para la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV). 100% (DDL)

El proyecto consiste en desarrollar un proceso formativo dirigido a las personas participantes y sus grupos familiares para la promoción de la autogestión, el fortalecimiento del tejido social y la mejora de sus condiciones de vida principalmente en las 5 áreas: Salud, Convivencia familiar, Alimentación Sana, Medio Ambiente y Economía familiar. Previo a ello, se realizará un

diagnóstico comunitario y conformarán los Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV). El proceso también implica el desarrollo de visitas domiciliarias con el fin de dar acompañamiento a las acciones de mejora implementadas por los participantes. Además, se realizarán capacitaciones especializadas, intercambio de experiencias entre los CMV y una exposición de los logros obtenidos durante el proceso de acompañamiento.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
78%	79%	100%

- 145 diagnósticos Comunitarios elaborados mediante los cuales se hará la inmersión en las comunidades, en los siguientes municipios:
 1. Jutiapa, Cabañas
 2. El Rosario, Cuscatlán
 3. San Juan Opico, La Libertad
 4. San Antonio Masahuat, La Paz
 5. El Carmen, La unión
 6. Cacaopera, Morazán
 7. Chilanga , Morazán
 8. Corinto, Morazán
 9. Gualococti, Morazán
 10. Guatajiagua, Morazán
 11. Joateca, Morazán
 12. San Fernando, Morazán
 13. San Isidro, Morazán
 14. San Simón, Morazán
 15. Torola, Morazán
 16. Villa El Rosario, Morazán
 17. Chirilagua, San Miguel
 18. San Antonio, San Miguel.
 19. Apastepeque, San Vicente
 20. San Estaban Catarina, San Vicente
 21. San Ildefonso, San Vicente
 22. San Sebastián, San Vicente
 23. Santa Clara, San Vicente
 24. Metapán, Santa Ana
 25. Armenia, Sonsonate
- 178 Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV) conformados, con un total de 2,442 participantes (1,983 mujeres y 459 hombres)
- 941 jornadas de Reflexión desarrolladas con los participantes de los CMV en temáticas para mejorar su condición de vida. Entre los temas de reflexión están:

1. Cuido y limpieza personal	9. Gestión de la economía familiar
------------------------------	------------------------------------

2. Casa limpia y ordenada	10. El tiempo es mi vida
3. Autoestima y prácticas de higiene	11. Conviviendo en el corazón de la casa
4. Cuidemos el agua fuente de vida y salud	12. Valorando mis mejoras en la vida
5. Cuidemos el agua fuente de vida y salud	13. Mi plan de vida
6. Alimentación y familia sanas	14. Estableciendo mi círculo
7. Reflexionando en un medioambiente sano en nuestras casas y comunidad	15. Generación de confianza y autoconocimiento
8. Ver, comprender y desechar con amor lo que no me sirve para que mi corazón y mi vida crezca	

- 754 planes de vida de participantes de los CMV implementados.
- 21,818 visitas domiciliarias realizadas para el seguimiento de los compromisos de participantes de los CMV. Las visitas domiciliarias, correspondientes al mes de junio (6,550), no se pudieron realizar de manera presencial en casa de los participantes, pero los promotores dieron seguimiento haciendo uso de la tecnología disponible a través de llamadas telefónicas, video llamadas, mensajes de texto; sin embargo cabe mencionar que algunos promotores si han tenido la oportunidad de visitar a algunas familias cuando realizaron actividades de apoyo por la emergencia a la municipalidad o cuando los promotores están apoyando a los Alcaldes, por lo que aprovechan para dar seguimiento a los compromisos de los participantes de CMV.
- 797 capacitaciones especializadas desarrolladas para el aprovechamiento de los recursos locales, con un total de 5,504 participantes de (4,769 mujeres y 735 hombres). Dentro de los temas desarrollados se encuentran la elaboración de velas, jabón de glicerina, Shampoo, Donas, Vino, Mermelada, Encurtido, concentrado artesanal, Pomadas de Vick sábila y chichipinse, azufre y la introducción a la Agricultura Orgánica.

Pr.1.3.1.e. Fortalecer capacidades en temas de género a personal técnico. 100% (UGE)

El proyecto consiste en desarrollar varios procesos de formación en: 1) masculinidades a promotores de Mejoramiento de Vida, Asesores Municipales y Asesores en Desarrollo, que incluye

espacios de reflexión y auto crítica con énfasis en los aportes de los estudios de las masculinidades y la educación emocional, utilizando herramientas y metodologías lúdicas donde se aborden temas relacionados con la construcción de masculinidades libres de las violencias sociales y la violencia basada en género; 2) con las personas encargadas de las unidades de la mujer o de género de las Municipalidad en formación en género, tomando a esta como entidad conductora del desarrollo local y articuladora de esfuerzos entre actores, sectores y ciudadanía en general a manera de transversalidad el enfoque de género en los territorios. Ambos procesos mediante consultoría; 3) formación básica dirigida al personal de MINDEL y FISDL sobre Igualdad Sustantiva y Vida libre de Violencia a través de la escuela de formación del ISDEMU, en dos modalidades, una presencial, con una duración de 5 días taller por cada uno de los cursos, haciendo un total de 10 días de capacitación, y otra modalidad en línea que incluye dos sesiones presenciales. Además, con el fin de sensibilizar al personal en este tema se organizarán 2 conmemoraciones, siendo, Día Internacional y nacional de la Mujer y Día de la no violencia contra la mujer.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
93%	93%	100%

1. Desarrollo de Cursos Presenciales y virtuales: 24 personas capacitadas

Tema	Mujeres	Hombres
ABC de igualdad Sustantiva	18 MINDEL	6 FISDL

Curso impartido por la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU en su primera sesión de un total de cinco. Debido a la situación del COVID-19 los cursos de “ABC de la Igualdad Sustantiva” y “ABC vida libre de violencia” presenciales programados para los meses de mayo y junio no se pudieron realizar, ya que estos han quedado suspendidos hasta nuevo aviso por lo que ya se está en coordinación con la EFIS del ISDEMU para reprogramar los cursos presenciales.

2. Desarrollo de Cursos Virtuales: 14 personas capacitadas

Tema	Mujeres	Hombres
ABC de igualdad Sustantiva	10 MINDEL	
ABC vida libre de violencia	3 MINDEL	1 FISDL

Ambos procesos formativos son parte de la “Estrategia de formación en igualdad sustantiva” del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

- Proceso de capacitación sobre Marco normativo del nivel intermedio, en modalidad Virtual a través de la EFIS del ISDEMU. En este proceso que duro 9 semanas participaron 5 personas (mujeres) 4 de MINDEL y una de FISDL
- Curso de Especialización “Salud Sexual y Reproductiva” en modalidad Virtual a través de la EFIS del ISDEMU. En este proceso que duro 11 semanas participaron 5 personas (mujeres) 4 de MINDEL y una de FISDL
- Se desarrolló una **campaña de sensibilización** en la conmemoración del día nacional e internacional de la Mujer, en la cual se presentó una obra de teatro del grupo “La Cachada”, según el detalle de participación:

Sede	Mujeres	Hombres	Total
San Jacinto	51	41	92
Santa Elena	66	36	102
Total	117	77	194

Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura. 100% (GIN)

El proyecto consiste en implementar el protocolo de capacitación en sus 7 módulos, asambleas comunitarias y seguimiento a las juntas administradoras de agua potable en varios proyectos de infraestructura en ejecución de las 3 zonas del país.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
9%	9%	100%

Durante este periodo se realizó:

- **Seguimiento a juntas administradoras de proyectos de agua** en 4 proyectos de los municipios de Apastepeque (2), Panchimalco (1) y Victoria (1).
- **Desarrollo de Protocolo de capacitación por módulos** a personas beneficiarias de las obras de infraestructura:

N°	Modulo	N° Capacitaciones	Municipios
1	Ciclo del Proyecto	2	Quezaltepeque
2	Contabilidad y finanzas	2	Tecoluca y San Miguel
3	Organización y participación comunitaria	2	San Miguel

- **Desarrollo de Asambleas con población beneficiaria de los proyectos:** 6 Asambleas realizadas en los municipios de Metalío (1), Ahuachapán (3), Tecoluca (1) y San Miguel (1).

PR.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local

Pr.1.3.2.b. Fortalecer las capacidades locales para la planificación participativa con el Enfoque de Mejoramiento de Vida. **62%** (DDL)

El proyecto consiste en la implementación de acciones dirigidas a dotar de nuevos enfoques y metodologías, así como de herramientas técnicas, operativas y de recursos materiales básicos a los gobiernos locales y comunidades, para cualificar su gobernanza y gestión administrativa en general y particularmente en la gestión de programas sociales con enfoque de Mejoramiento de Vida (MV). Las cuales son: la aplicación del Diagnóstico de Autoevaluación Municipal, Planes de mejoramiento municipal, Planes Estratégicos Participativos (PEP) y Planes de Acción Comunitarios (PACO).

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	46%	62%

- 20 jornadas de Formación realizadas, dirigidas a promotores de Mejoramiento de Vida, promotores sociales y empleados municipales. Estas jornadas se desarrollaron de manera centralizada, con un total de 98 participantes (60 mujeres y 38 hombres). De los municipios de:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Dolores, Cabañas | 17. Sensembra, Morazán |
| 2. Jutiapa, Cabañas | 18. Torola, Morazán |
| 3. Tejutepeque, Cabañas | 19. Yamabal, Morazán |
| 4. El Rosario, Cuscatlán | 20. San Simón, Morazán |
| 5. Santa Cruz Analquito,
Cuscatlán | 21. Villa el Rosario, Morazán |
| 6. San Juan Opico, La
Libertad | 22. Chirilagua, San Miguel |
| 7. San Antonio Masahuat, La
Paz | 23. San Antonio, San Miguel |
| 8. El Carmen, La Unión | 24. Sessori, San Miguel |
| 9. Cacaopera, Morazán | 25. Apastepeque, San Vicente |
| 10. Chilanga, Morazán | 26. San Idelfonso, San Vicente |
| 11. Corinto, Morazán | 27. San Sebastián, San Vicente |
| 12. Gualococti, Morazán | 28. Santa Clara, San Vicente |
| 13. Guatajiagua, Morazán | 29. San esteban Catarina, San
Vicente |
| 14. Joateca, Morazán | 30. Metapán, Santa Ana |
| 15. San Fernando, Morazán | 31. Armenia, Sonsonate |
| 16. San Isidro, Morazán | 32. Alegría, Usulután |
| | 33. Berlín, Usulután |
| | 34. Mercedes Umaña, Usulután |

Debido a la situación de la emergencia sanitaria COVID-19 quedaron pendientes de realizar 32 jornadas de formación a Promotores de Mejoramiento de Vida, Promotores sociales y empleados municipales, esto es lo que representa el 38% de no cumplimiento del proyecto.

CAPÍTULO II

RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS

RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.

(Porcentaje promedio de cumplimiento 71%)

El Resultado Estratégico 2.1, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 4 se presenta el porcentaje de cumplimiento correspondiente al periodo analizado:

Gráfico 4. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020



PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Pr.2.1.1.a. Fortalecer la implementación del enfoque de Gestión Ambiental. 71% (DGA)

El proyecto consiste en realizar capacitaciones en temas de Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Cambio Climático a Unidades Ambientales Municipales, Comités de Protección Civil y Unidades de Proyectos de las diferentes municipalidades. Además, verificar y hacer cumplir aspectos ambientales en las Carpetas Técnicas, Proyectos en Ejecución y Responsabilidad Ambiental Institucional.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
50%	36%	71%

- **Revisión de procesos y procedimientos de Gestión Ambiental de los proyectos en ejecución**, la modificación de los documentos se sometió a aprobación del CAD Sesión DL 1148/2020 de fecha 31 de julio 2020, PR-C.2.4 Aseguramiento de la Calidad en Proyectos de Infraestructura.
- **Desarrollo de capacitaciones**, se han impartido las siguientes:
 - Capacitación en línea denominada "Auditorías Ambientales" para personal del FISDL y de las municipalidades. Esta se desarrolló en 4 módulos, con una duración de 60 horas y con 19 participantes (15 mujeres y 4 hombres)
 - Curso "Sistemas de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales" Módulos 1 y 2, total de participantes 38 (20 mujeres y 18 hombres). Originalmente las capacitaciones estaban dirigidas principalmente a las Unidades Ambientales

Municipales, pero debido a que por requerimiento del MARN para que todas las instituciones gubernamentales posean un Sistema de Gestión Ambiental y un Comité de Gestión Ambiental, se redirigió la capacitación en línea para el personal del FISDL y poder así conformar el Comité de Gestión Ambiental.

- **Instalación del Comité de Gestión Ambiental del FISDL dentro del Marco del SINAMA**, para el mes de septiembre se había programado la conformación del comité, pero debido a que este se conformará con personal que ha tomado la totalidad de los 4 módulos del Curso “Sistemas de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales” se trasladará la conformación de este para el mes de noviembre. Por lo anterior el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto es del 29%.

CAPÍTULO III


RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **67%**)

El Resultado Estratégico 3.1, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos de los cuales uno tenía un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 5 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a este proyecto:

Gráfico 5. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020



PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno

Pr.3.1.1.a. Entregar las transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Interno. **67%** (DRT)

El proyecto consiste en la entrega de Transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los DDHH sufridos en el contexto del conflicto armado interno, a través de la ejecución del Programa Indemnizatorio contemplado en el Decreto Ejecutivo N° 204, de fecha 23 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial N° 197, Tomo N° 401.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
60%	40%	67%

N°	Concepto	Planillas programadas	Planillas devengadas	Entregas realizadas
1	transferencias monetarias no condicionadas a personas del Programa Indemnizatorio	8	8	4

Con relación a la entrega de las transferencias monetarias a personas y familias del Programa Indemnizatorio, se había programado realizar el pago de las transferencias correspondientes a 8 planillas, pero debido a que no se recibieron fondos por parte del Ministerio de Hacienda, no se pudieron realizar según lo programado. Se harán las gestiones con el Ministerio de Hacienda sobre los fondos requeridos para realizar el pago de las Transferencias. Por lo anterior el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto es del 33%.

CAPÍTULO IV


RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL

RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **61%**)

El Resultado Estratégico 4.1, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos los cuales ambos tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 6 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 6. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

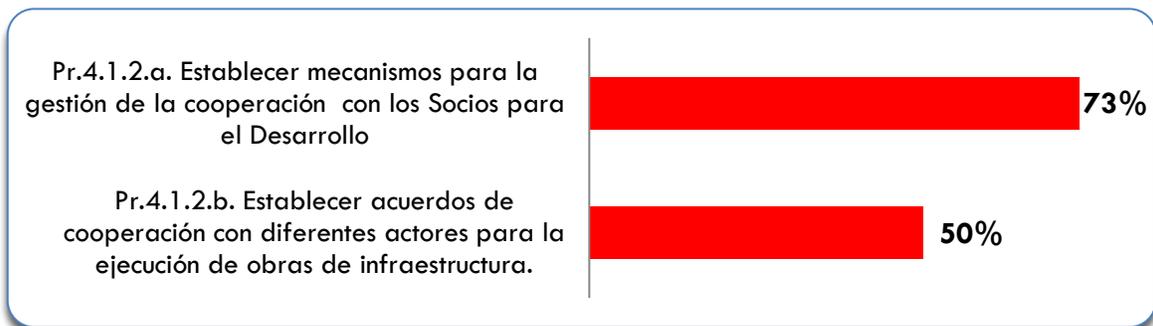

PR.4.1.2 Establecidas alianzas estratégicas y de cooperación.

Pr.4.1.2.a. Establecer mecanismos para la gestión de la cooperación con los Socios para el Desarrollo. 73% (DCI)

El proyecto consiste en contar con una estrategia de cooperación internacional que sirva de marco de acción para la gestión institucional de recursos para proyectos con enfoque de desarrollo local con Socios para el Desarrollo; así también, el desarrollo de un proceso de formación de capacidades técnicas para la elaboración de proyectos dirigidos al personal del FISDL.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
72%	53%	73%

Actividades en el marco del proyecto:

1. Formulación y presentación de perfiles de proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, a través de la Secretaría de Innovación para formar parte de la Agenda de Prosperidad de El Salvador y obtener recursos institucionales para los proyectos:

- “Desarrollo de emprendimientos solidarios para el apoyo a iniciativas productivas de población migrante retornada.”
- “Construcción de cohesión social en comunidades educativas y juventudes en municipios de El Salvador.”
- “Fortalecimiento de capacidades para el acompañamiento familiar y comunitario de los equipos técnicos institucionales, municipalidades y otras instancias relacionadas con la ejecución de la Política de Desarrollo Local.”

Se elaboró un perfil de proyecto para gestionar fondos de cooperación en colaboración con la nueva Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional -ESCO-: 1. Programa de construcción y mejoramiento de Infraestructura Socioeconómica Resiliente, ante la crisis por la emergencia del COVID-19.

2. Propuesta de mesa institucional de diálogo con los Socios para el Desarrollo. Durante el mes de septiembre no se logró elaborar la propuesta, debido a que en el equipo hubo un cambio en el personal, que incidió en el seguimiento y cumplimiento de la actividad programada. Sin embargo, esta propuesta será presentada en el mes de octubre, en los términos que se indica en el Plan Operativo. La no finalización de esta actividad según lo programado es lo que representa el 27% de no cumplimiento del proyecto.

Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. 50% (GIN)

El proyecto consiste en suscribir convenios con instituciones de gobierno, gobiernos locales y empresas privadas, así como su correspondiente seguimiento, para la ejecución de obras de infraestructura en 12 municipios, para las tipologías de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, espacios de convivencia ciudadana y espacios para formación. Estas obras se ejecutarán bajo la modalidad centralizada y descentralizada.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
41%	21%	50%

Durante este periodo se realizó:

- Seguimiento de 3 convenios de ejecución centralizada con el Gobierno Local de los municipios de Jujutla, Yamabal y Soyapango.
- Seguimiento de convenio de ejecución descentralizada con el gobierno local del municipio de Santiago Nonualco.
- Suscripción de convenios de responsabilidad social con instituciones públicas, 2 convenios de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y FISDL.

El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección D de este informe.

Para este periodo quedaron pendientes de suscribir los siguientes convenios:

ACTIVIDAD	CONVENIO	OBSERVACIONES
Convenios de ejecución con los gobiernos locales (centralizados y descentralizados)	Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable	Se retomó su revisión en agosto y la Gerencia de Legal finalizó su revisión la última semana de septiembre, actualmente está en firma del alcalde por lo que se espera tener el convenio firmado por la ministra en octubre.
Suscripción de convenios de ejecución con los gobiernos locales (centralizados y descentralizados)	Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CICC Chancuyo Centro, I Etapa.	El convenio ya está en poder del alcalde, pero está analizando el mismo, puesto que actualmente no cuenta con la contrapartida que se solicita; en parte por el retraso en la entrega de los fondos FODES.
Suscripción de convenios de responsabilidad social con instituciones públicas y privadas	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y SONSONATE SOLAR, S.A. DE C.V.	Aún no han sido firmados ya que no han sido finalizadas las gestiones con las empresas.

Además, se tenía programado el seguimiento a dos convenios, pero debido a que estos aún no han sido firmados, por las causas detalladas en el cuadro anterior, no se pudo realizar el seguimiento según lo programado. Estos son:

ACTIVIDAD	CONVENIO
Seguimiento de convenio de ejecución con el Gobierno Local centralizado	Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CCICC Chancuyo Centro, I Etapa.
Seguimiento de convenios de responsabilidad social	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Metapán, el FISDL y VENTUS S.A. DE C.V.

Por lo anterior el proyecto tiene un porcentaje de no cumplimiento del proyecto del 50%

CAPÍTULO V


RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE

RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.

(Porcentaje promedio de cumplimiento 90%)

El Resultado Estratégico 5.1, para el año 2020, está compuesto por 7 proyectos de los cuales 4 tenían un avance de ejecución programado para el período que abarca este informe. En el gráfico 7 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 7. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

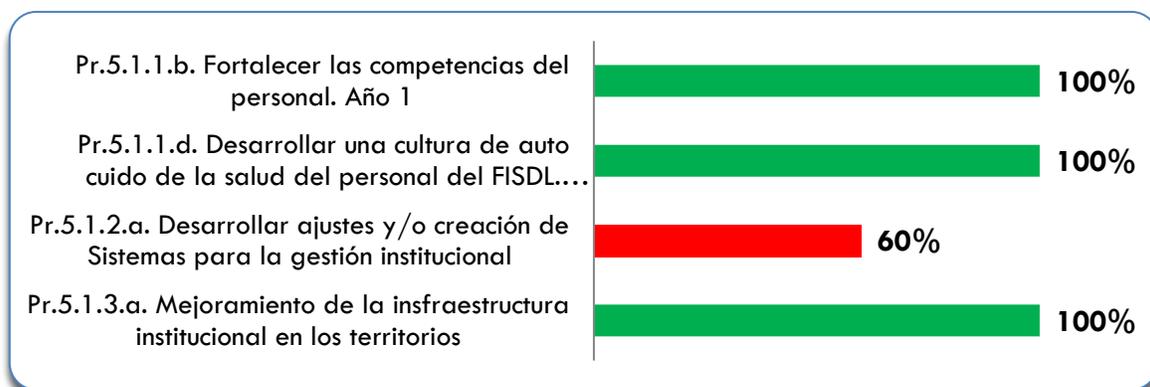

PR.5.1.1 Talento humano fortalecido

Pr.5.1.1.b. Fortalecer las competencias del personal, Año 1. 100% (DGT)

Desarrollar las competencias del personal del FISDL basado en la Gestión por Competencias, que responda a los descriptores de puesto; así como también a los temas inherentes al trabajo institucional. Gestionar actividades de capacitación y formación para que el personal del FISDL, desarrolle y fortalezca sus competencias promoviendo el crecimiento personal y profesional para el logro los objetivos de la institución.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	100%	100%

Se ha facilitado un total de 34 eventos de capacitación:

- 23 eventos con temas de fortalecimiento de competencias del personal
- 11 eventos con temas de fortalecimiento de competencias personales e institucionales (incluye Enfoque de Género, Ética, Transparencia y orientación a la ciudadanía)

Con un total de 274 personas capacitadas (143 mujeres y 131 hombres), este número corresponde a personal de FISDL que ha recibido al menos una capacitación durante este periodo, ya que una misma persona puede recibir más de una capacitación en el mismo periodo. Es decir que el 100% del personal de la institución ha participado en algún evento de capacitación o formación.

El número de capacitaciones facilitadas para este periodo fue mayor al programado, esto debido a que INSAFORP habilitó capacitaciones en línea y también al aumento de la demanda de capacitaciones por lo que se aprovecharon estas oportunidades para capacitar al personal.

Pr.5.1.1.d. Desarrollar una cultura de auto cuidado de la salud del personal del FISDL. Año 1. 100% (DGT)

El proyecto consiste en desarrollar dos programas de salud mental y física con todo el personal de la institución, siendo uno el programa "Yo me cuido, por mi familia y por mi" y el otro el programa "Yo me quiero y cuido mi salud mental" , ambos programas van dirigidos a cuidarse la salud por una parte la salud física y por otra la salud mental que conllevan a practicar actividades con cierta repeticiones o frecuencia para ir creando hábitos individuales que nos llevarán a tener costumbres (colectivas) que conformaran la cultura de auto cuidado.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
50%	50%	100%

Programas elaborados:

1. "Yo me cuido. Por mi familia y por mi " Educación preventiva sobre medidas contra COVID 19, Entrega de material de Bioseguridad a todo el personal, Orientación y seguimiento a consultas de empleados vía teléfono, ejercicios de estiramiento para el personal, Webinar de Mitos y verdades sobre COVID19.

2. "Yo me quiero y cuido mi salud mental" Orientación y seguimiento a consultas de empleados vía teléfono, correo o WhatsApp, Seguimiento a pacientes metabólicos, Educación preventiva sobre medidas contra COVID 19 y Dengue, Envío de información, ejercicios de estiramiento para el personal

Para la elaboración de estos dos programas de salud se realizó un grupo focal, en cual participaron 11 personas (Mujeres 9 y hombres 2), a partir del cual se definieron los hábitos de auto cuidado a desarrollar y fortalecer.

PR.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital

Pr.5.1.2.a. Desarrollar ajustes y/o creación de Sistemas para la gestión institucional. 60% (GST)

El proyecto consiste en el desarrollo y/o mejoramiento de plataformas informáticas para dar cumplimiento a las necesidades del día a día de las unidades del FISDL, mediante tareas automatizadas, soluciones innovadoras y propuestas de solución que incorporan nuevas tecnologías.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
83%	50%	60%

1. Mejora de Sistema de Garantías - FISDL.

Se realizó el análisis y diseño de la mejora del Sistema de Garantías, se elaboraron los documentos siguientes: “Sistema de Garantías - Propuesta de Modificación de Sistema”, CU-002 Registro de Reclamos Administrativos.docx y Caso de Uso, se realizaron las pruebas del sistema con la Gerencia Legal y se generaron los documentos correspondientes.

2. Creación de Sistemas de Requerimiento-FISDL.

Se realizó el análisis y diseño del Sistema de Requerimientos, se han elaborado los documentos: CU-001 Registro de Requerimiento FISDL.docx, CU-002 Aprobación de Requerimiento FISDL.docx, CU-003 Visto Bueno de Requerimiento FISDL.docx, CU-004 Asignación de Requerimiento FISDL.docx, CU-005 Solución de Requerimiento FISDL.docx el cual está para revisión de la Gerencia de Sistemas y Tecnología. Se ha desarrollado el registro del Requerimiento, Aprobación de Requerimiento, Asignación de Requerimiento, Solución de Requerimiento. Se hizo la presentación del sistema y surgieron observaciones que deberán de ser corregidas para la implementación de este.

Se ha analizado que es necesario hacer ajustes al sistema de requerimientos que son necesarios para la operación completa del sistema, por lo que tomará más tiempo el desarrollo y puesta en producción.

3. Creación de Sistema de Planificación y Seguimiento Institucional.

Se recibió solicitud para elaborar el Sistema de Planificación para el seguimiento de metas de la institución. A partir de esta solicitud se elaboraron los documentos: Diagrama Entidad Relación Inicial Borrador, Carga masiva del Plan Operativo Anual e ingreso y edición de Plan Operativo Anual, que forman parte del desarrollo del sistema. Se realizaron las pruebas correspondientes y se ha finalizado la etapa de “Carga masiva, ingreso y edición de Plan Operativo Anual”.

Se realizó el desarrollo del Caso CU-SPI-004 Seguimiento del Plan Operativo Anual (Técnico) y CU-SPI-003 Seguimiento del plan operativo anual (Gestor) y se realizaron ajustes correspondientes, estos están en etapa de prueba por parte del usuario. Durante el periodo de cuarentena se dificultó el acceso al sistema de pruebas para realizar las pruebas de la fase 1, lo cual ocasionó un atraso en el desarrollo de la siguiente fase es por eso por lo que la fase 2 no se pudo finalizar en el mes de septiembre según lo programado, por lo que al finalizar las pruebas se procederá a implementar dicha fase en producción.

Debido a los inconvenientes que se ha tenido en los sistemas de Requerimiento-FISDL y Planificación y Seguimiento Institucional es lo que representa el 40% de no cumplimiento de este proyecto.

PR.5.1.3 Infraestructura física e instalaciones adecuadas

Pr.5.1.3.a. Mejoramiento de la infraestructura institucional en los territorios. 100% (DAD)

El proyecto consiste en la readecuación de espacio para ubicación de oficina administrativa que será utilizada por el personal de la institución asignados a la zona occidental del país.

Descripción de avance:

<i>Avance programado:</i>	<i>Avance ejecutado:</i>	<i>Porcentaje de cumplimiento:</i>
100%	100%	100%


Se readecué y equipó espacio para oficina de FISDL en bodega Santa Ana para personal de la Gerencia de Desarrollo Social.

RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **93%**)

El Resultado Estratégico 5.2, para el año 2020, está compuesto por 13 proyectos de los cuales 12 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 8 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondiente a cada uno de estos proyectos:

Gráfico 8. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020

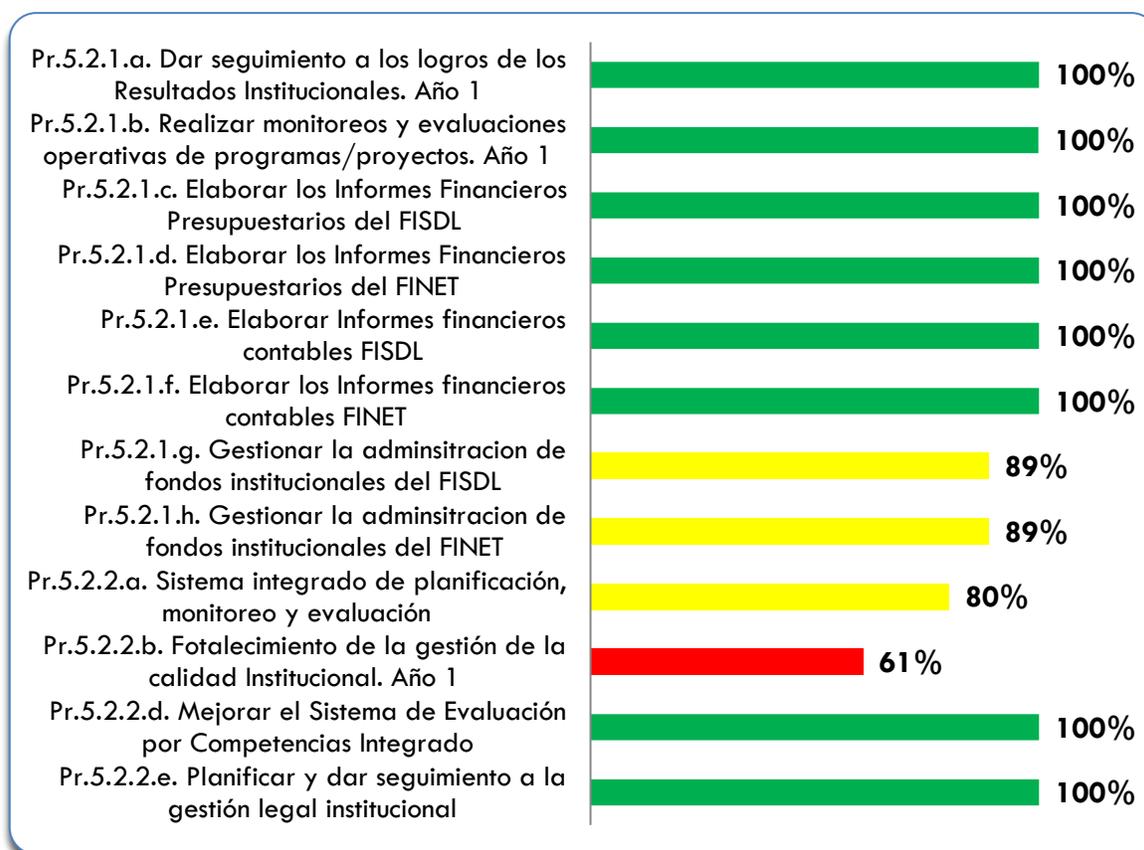

PR.5.2.1 Resultados y evidencia

Pr.5.2.1.a. Dar seguimiento a los logros de los Resultados Institucionales, Año 1. 100% (DPL)

Realizar diversos Informes que contengan los logros alcanzados por la Institución en el marco del Plan de Gobierno y Planes Estratégico y Operativo Institucionales, tales como la Memorias

de Labores, Rendición de Cuentas a Ciudadanía, Informes por año de Gestión Presidencial, Informes del Programa Anual de Inversión Pública, Informes POA trimestrales etc. Algunos de estos requieren la aprobación del CAD previo a ser difundidos, ya sea al personal del FISDL, CAPRES, Ministerio de Hacienda.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
69%	69%	100%

Actividades consideradas en este proyecto:

1. **Memoria de Labores FINET del año 2019**, presentado a la presidenta FISDL.
2. **Memoria de Labores FISDL del año 2019**, presentado a la presidenta FISDL
3. **Informes de avance del Plan Anual de Inversión Pública –PAIP**, correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a agosto 2020, los cuales han sido presentados al Jefe de Planificación y a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional.
4. **Informe de cumplimiento de metas POA**, se elaboraron los 2 informes trimestrales correspondientes, los cuales fueron presentados al CAD en un informe semestral.

Pr.5.2.1.b. Realizar monitoreos y evaluaciones operativas de programas/proyectos, Año 1.

100% (DME)

El proyecto consiste en realizar el monitoreo y evaluación de las intervenciones (en programas y proyectos) que se desarrollan en la Gerencia de Infraestructura (GIN) y Gerencia de Desarrollo Social (GDS) para la consecución de las metas y objetivos institucionales establecidos conforme a planes anuales validados con la GIN, GDS y Gerencia General de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Estos se realizan en coordinación con las áreas relacionadas. Los monitoreos se realizan con el personal del departamento; las evaluaciones pueden ser a través de dos modalidades: evaluaciones realizadas directamente por el personal del DME y por consultorías externas para los cuales se elaboran los términos de referencia y los contratos son administrados por el personal del departamento, realizando todo el proceso conforme al Plan de Trabajo elaborado y validado con las unidades involucradas/cooperantes. Los monitoreos una vez aprobados por la jefatura del DME se socializan con los involucrados y las evaluaciones se presentan al CTC para conocimiento y acciones correspondientes.

Además, se recopila información para la elaboración de informes de carácter técnico-financiero en función de la ejecución de los programas para ser entregados a cooperantes e instituciones.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
67%	67%	100%

Actividades consideradas en este proyecto:

1. Elaboración de informes a cooperantes/instituciones sobre la ejecución de proyectos y programas:

N°	Informes	Periodo	Estado
1	Desembolsos del Programa Fondo Agua (5 informes)	Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero a Junio 2020 Julio 2020 Septiembre 2020	Remitidos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
2	Seguimiento Trimestral 2020 de avances del componente social SLV 056-B y SLV-01-B Programa Fondo de Agua (3 informes)		Remitidos a la AECID
3	Avance trimestral del Programa CONVIVIR (3 informes)	Noviembre 2019- Enero 2020 Febrero – abril 2020 Mayo –Julio 2020	Remitidos al Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW)
4	Avance semestral del Programa Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (2 informes)	Julio-Diciembre 2019 Enero-Junio 2020	Remitido a la ANDA

2. Desarrollo de monitoreo a proyectos y programas:

- Monitoreo de transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a enero 2020; correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Social, periodo de análisis octubre 2019 a enero 2020. El cual se realizó con el objetivo de dar seguimiento a proyectos con transferencias a municipalidades que presentan mora mayor o igual a 90 días al mes de enero de 2020.

- Informe de monitoreo de transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a agosto/2020, a GIN y GDS, respectivamente. Los cuales se realizaron con el objetivo de dar seguimiento a proyectos con transferencias a municipalidades que presentan mora mayor o igual a 90 días al mes de agosto de 2020.
- 3. Socialización de informes de monitoreo con las Unidades responsables de los proyectos,** se socializaron los Informes de monitoreo de transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a agosto 2020 en reunión con la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Legal y Departamento de Monitoreo y Evaluación, a fin de tomar acciones para la disminución de los saldos de transferencias pendientes de liquidar.
- 4. Desarrollo de evaluaciones a proyectos o programas financiados con la cooperación:**
- "Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Red Solidaria Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía". El objetivo principal fue realizar un análisis sistemático de la gestión operativa que garantice el cumplimiento de objetivos y resultados del Proyecto, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad del diseño, procesos y resultados, así como su sostenibilidad que proporcione lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan la instrumentalización de mejoras
 - "Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía". El objetivo principal fue realizar un análisis sistemático de la gestión operativa que garantice el cumplimiento de objetivos y resultados del Proyecto, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad del diseño, procesos y resultados, así como su sostenibilidad que proporcione lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan la instrumentalización de mejoras.
- 5. Presentación de los resultados de las evaluaciones al Comité Técnico Consultivo (CTC):**
- "Evaluación de Resultados de los proyectos de electrificación rural ejecutados en el año 2017, con fondos FINET" el objetivo de la evaluación era conocer los cambios directos en la vida de los beneficiarios a consecuencia de la ejecución de los proyectos, con respecto a los subsidios en el consumo doméstico y condiciones de vida.

- “Evaluación de Impacto del Programa Emprendimiento Solidario (PES)”, en intervenciones del periodo 2015 a 2017. La evaluación consistió en realizar el análisis de las actividades realizadas en el marco del fortalecimiento de capacidades en las personas participantes-beneficiarias a fin de impulsar y ejecutar iniciativas de emprendimientos.
- “Evaluación de Resultados Proyecto Apoyo al Programa Red Solidaria Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía”.
- "Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía".

Pr.5.2.1.c. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios del FISDL. 100% (GFI)

El proyecto consiste en coordinar y asignar recursos financieros de acuerdo con necesidades de las diferentes unidades, desde la liquidación del presupuesto del año anterior y la formulación del presupuesto correspondiente al siguiente ejercicio financiero fiscal y el mantenimiento del presupuesto del año corriente de acuerdo a las solicitudes de la unidad ejecutora.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
100%	100%	100%

1. Se realizó la Liquidación del Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 y se elaboró el anteproyecto de Ley de presupuesto del ejercicio financiero fiscal 2021.

2. Con el fin de mantener el presupuesto del año corriente de acuerdo con las necesidades de los ejecutores se realizó el registro del presupuesto 2020 en Sistema Presupuestario (FISDL) y SAFI y se han se realizado 567 modificaciones presupuestarias en atención de las demandas de las unidades ejecutoras.

4. Control financiero de convenios a través de la elaboración de informes financieros de convenios: 2 informes semestrales BID, 16 informes mensuales de las tres fuentes de la Junta de Andalucía, 9 informes mensuales de detalles de gastos ANDA, 3 informes trimestrales KFW CONVIVIR, 1 informe semestral del Ministerio de Relaciones Exteriores, 3 informes trimestrales FANTEL.

5. Liquidación de Gastos ante Organismos Financiadores: 1 justificación de gastos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
6. Gestión de fondos ante Organismos Financiadores: 1 solicitud de desembolso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2 solicitudes de fondos a KFW convivir.
7. Liquidación de convenio: 1 de Junta Andalucía Intereses de la Oficina Técnica de Operaciones OTC, 1 de Junta Andalucía, Subvención, 3 de Junta Andalucía Intereses de la cuenta corriente, intereses de la Oficina Técnica de Cooperación OTC y de multas y penalidades y 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
8. Elaboración de mensual de conciliaciones bancarias (8) y 8 informes de transacciones bancarias pendientes de registrar
9. Informes para la Dirección General de Inversión y Crédito Público (9)
10. Revisión y aceptación de liquidaciones de proyectos descentralizados (9)
11. Informes mensuales de liquidaciones aceptadas por fuente de financiamiento (9)

Pr.5.2.1.d. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios del FINET. 100% (GFI)

El proyecto consiste en coordinar y asignar recursos financieros de acuerdo con las necesidades de las diferentes unidades, desde la liquidación del presupuesto del año anterior y la formulación del presupuesto correspondiente al siguiente ejercicio financiero fiscal y el mantenimiento del presupuesto del año corriente de acuerdo a las solicitudes de la unidad ejecutora.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
100%	100%	100%

1. Se realizó la liquidación del Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 y se formuló el presupuesto del siguiente ejercicio financiero fiscal: se elaboró el anteproyecto de Ley de presupuesto del siguiente ejercicio financiero fiscal
2. Con el fin de mantener el presupuesto del año corriente de acuerdo con las necesidades de los ejecutores: se registró el presupuesto aprobado, correspondiente

a FINET, en Sistema Presupuestario (FISDL) y SAFI, y se elaboraron 43 modificaciones presupuestarias en atención de las demandas de las unidades ejecutoras.

Pr.5.2.1.e. Elaborar Informes financieros contables FISDL. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar, de forma mensual, la validación de todos los ingresos, egresos y todos aquellos registros contables necesarios, elaborar los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros (cuando aplique) para dar cumplimiento a la normativa técnica y legal; así también para informar a los diferentes Organismos con los cuales se tienen este tipo de exigencias (FOCAP-PAPSES, FANTEL, entre otros).

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	75%	100%

1. Se elaboraron los Estados Financieros: Situación Financiera, Rendimiento Económico, Ejecución Presupuestaria y Flujo de Fondos.
2. Se elaboraron Notas a los Estados Financieros Institucionales y de Organismos (FOCAP-PAPSES y FANTEL).
3. Remisión de 53 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria requeridos por la Dirección General De Contabilidad Gubernamental.
4. Integración de cuentas contables
5. Elaboración de Términos de Referencia de Auditorías Externas Institucionales (FISDL, FANTEL y Convivir) y de Convenios (Ficha de Agua 2010)

Pr.5.2.1.f. Elaborar los Informes financieros contables FINET. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar, de forma mensual, la validación de todos los ingresos, egresos y todos aquellos registros contables necesarios, debe de elaborar los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros para dar cumplimiento a la normativa técnica y legal.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	75%	100%

1. Se elaboraron los Estados Financieros: Situación Financiera, Rendimiento Económico, Ejecución Presupuestaria y Flujo de Fondos.
2. Se elaboraron Notas a los Estados Financieros Institucionales
3. Remisión de 53 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria requeridos por la Dirección General De Contabilidad Gubernamental.
4. Elaboración de Términos de Referencia de Auditorías Externas Institucionales (Estados Financieros y Subsidios)

Pr.5.2.1.g. Gestionar la administración de fondos institucionales del FISDL. 89% (GFI)

El proyecto consiste en realizar los trámites requeridos ante el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos de compromisos institucionales, así mismo garantizar el custodio de las garantías de contratistas en coordinación con la DACI, y atender embargos judiciales y descuentos a empleados de la institución.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	66%	89%

1. Administración del flujo efectivo necesario para cancelar los compromisos institucionales. Se han realizado 8 gestiones ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de fondos necesarios para atender los compromisos institucionales de pagos
2. Se elaboraron 8 informes sobre la proyección mensual de egresos e ingresos los cuales fueron presentados al Consejo de Administración (CAD)
3. Custodia de documentos de garantías de contratistas remitidos al Departamento de Tesorería por el departamento de Adquisiciones y Contrataciones (ACI), esto incluye la recepción y devolución de dichos documentos
4. Seguimiento a embargos judiciales vigentes y obtención de informes de descuentos realizados a los empleados por el Departamento de Gestión del Talento Humano

Los avances correspondientes al mes de septiembre no habían sido remitidos por la GFI a la fecha en que se programó la recepción de los informes de las unidades organizativas.

Pr.5.2.1.h. Gestionar la administración de fondos institucionales del FINET. 89% (GFI)

El proyecto consiste en realizar los trámites requeridos ante el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos de compromisos institucionales, así mismo garantizar el custodio de las garantías de contratistas en coordinación con la DACI, y atender embargos judiciales y descuentos a empleados de la institución.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
75%	66%	89%

1. Administración del flujo efectivo necesario para cancelar los compromisos institucionales. Se han realizado 8 gestiones ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de fondos necesarios para atender los compromisos institucionales de pagos.
2. Se elaboraron 8 informes sobre la proyección mensual de egresos e ingresos los cuales fueron presentados al Consejo de Administración (CAD).
3. Custodia de documentos de garantías de contratistas remitidos al Departamento de Tesorería por el departamento de Adquisiciones y Contrataciones (ACI), esto incluye la recepción y devolución de dichos documentos.

Los avances correspondientes al mes de septiembre no habían sido remitidos por la GFI a la fecha en que se programó la recepción de los informes de las unidades organizativas.

PR.5.2.2 Estándares y mejora continua

Pr.5.2.2.a. Sistema integrado de planificación, monitoreo y evaluación. 80% (DPL)

El proyecto consiste en elaborar un plan Institucional que integre los procesos de Planificación, Monitoreo y evaluación Institucional, con metas establecidas y mecanismos de retroalimentación de las diferentes intervenciones. Incluyendo además el desarrollo de una herramienta informática que contenga el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual, que permita que cada unidad/gerencia sea garante de la información del cumplimiento de metas de los proyectos ingresada en el sistema, lo que reforzaría el cumplimiento de los requerimientos y les facilitaría

el seguimiento y la supervisión de los proyectos correspondientes a su unidad, medición y control de los avances. Así también, realizar una medición de la satisfacción de la población vinculada a los proyectos de infraestructura y programas sociales con el fin de establecer acciones de mejora en los productos y servicios que entrega la institución.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
71%	57%	80%

Actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizaron los talleres correspondientes a la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) con la participación de 35 Gerentes y Jefes de la Institución (21 mujeres y 14 hombres). Con los insumos obtenidos en estos talleres se elaboró una sistematización para definir la Filosofía Institución, Resultados Generales y Específicos, así como los productos quinquenales. Además, se elaboró el documento correspondiente al PEI el cual fue aprobado por el CAD
2. Se realizaron 10 talleres de formulación del POA 2020 con 23 unidades de la Institución. Como resultado de los talleres se elaboraron los Planes de trabajo (PT) de los proyectos de estas Unidades, los cuales fueron revisados con el fin de obtener su versión final. Se elaboró el documento POA 2020 el cual fue aprobado por el CAD.
3. Dentro de este proyecto está considerada la adaptación de una herramienta informática para facilitar el proceso de planificación (en una primera fase). En el marco de esto se realizó el requerimiento a la Gerencia de Sistemas (entrega de solicitud) a partir de la cual se ha trabajado con el técnico de sistemas en la parametrización para la adaptación del módulo de formulación (ingreso de la información correspondiente a PEI y POA), se ha finalizado la primera fase del sistema.

Para el mes de septiembre se tenía programado finalizar la fase 2 del sistema correspondiente al seguimiento, pero debido a los inconvenientes que se tuvo en un inicio por la cuarentena para acceder a la interfaz de pruebas, ocasionó un desfase en las siguientes etapas de pruebas por lo que la fase de seguimiento no se finalizó en el mes de septiembre como se había programado. Las pruebas se realizaron en

los primeros días del mes de octubre y se espera tener finalizar el desarrollo de esta fase en la segunda semana de dicho mes. Esto es lo que representa el 20% de no cumplimiento del proyecto.

Pr.5.2.2.b. Fortalecimiento de la gestión de la calidad Institucional, Año 1. 61% (DOC)

El proyecto consiste en identificar y evaluar riesgos y oportunidades que incidan en el logro de los resultados institucionales, mejorar la normativa institucional aplicando los cambios necesarios para su operatividad, realizar auditorías internas y externas relacionadas a la gestión de la calidad, ejecutar revisiones por la dirección a fin de que sea la Alta Dirección que tome las decisiones necesarias en el marco de la mejora continua y facilitar capacitaciones al personal para fomentar la cultura de mejora continua y conocimientos en gestión de calidad.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
98%	59%	61%

Actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizó una auditoría interna de Calidad por 8 auditores FISDL (4 mujeres y 4 hombres), a partir de la cual se elaboraron 6 informes correspondientes a los siguientes procesos:
 - PR-A.3 Gestión Información y Tecnología
 - PR-A.4 Gestión del Talento Humano (Dotación de personal, Capacitación y Formación y Prestaciones sociales)
 - PR-A.4 Gestión del Talento Humano II (Administración de Remuneración y Controles, Prestaciones y Facilidades Laborales, Evaluación de Desempeño)
 - PR-A.6 Administración de Recursos Financieros (Presupuestar, Ingresos y Egresos)
 - R-A.7 Administración y Logística (Administración de Flota Vehicular y Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones)
 - PR-D.4 Gestión Normativa Interna
2. Actualización de Matriz de Riesgos del FISDL, se realizó la actualización de la Matriz de Riesgo y esta fue aprobada por el CAD en el mes de septiembre.

3. Se tiene aprobados por el CAD un total de 34 documentos de la normativa de procesos y procedimientos, según el siguiente detalle:

Proceso y procedimientos	Cantidad de Documentos aprobados
Gestión de Calidad y Mejora Continua	5
Gestión de Normativa Interna	3
Atención a la Ciudadanía	12
Gestión de contratos administrativos	7
Aseguramiento de la calidad y Gestión Ambiental	3
Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión en Capital Físico	4

- Proceso y procedimientos de Prefactibilidad de Proyectos los cuales están en proceso de revisión con unidad responsable.
- Proceso y procedimientos de Gestión Legal los cuales están en proceso de revisión por la unidad responsable
- Proceso y procedimientos de Adquisiciones y contrataciones, se remitieron a la unidad responsable para revisión y aún el DOC no ha recibido respuesta.

Para este periodo se habían programado dos auditorías de Calidad, una de seguimiento por el ente certificador y otra interna, pero debido a la emergencia sanitaria no se pudieron realizar. Por lo que la auditoría de seguimiento por el ente certificador se realizará en el mes de noviembre y para la auditoría interna de calidad, se realizará una reprogramación.

Además, las capacitaciones en gestión de calidad para líderes y personal de la Institución programadas para el mes de septiembre se suspendieron, debido al congelamiento de fondos requerido por el Ministerio de Hacienda, por lo que se trabajará un webinar para el mes de noviembre.

Las aprobaciones pendientes de los documentos correspondientes a los procesos y procedimientos antes mencionados, las auditorías de calidad pendientes y las capacitaciones en gestión de calidad pendientes es lo que representa el 42% de no cumplimiento del proyecto.

Pr.5.2.2.d. Mejorar el Sistema de Evaluación por Competencias Integrado. 100% (DGT).

El proyecto consiste en la definición y aprobación de Indicadores claves de Desempeño (KPI por sus siglas en inglés) a nivel de jefaturas, con el fin de que estos sean incorporados posteriormente al Sistema de Evaluación del Desempeño existente para identificar oportunidades de mejora en el desempeño del personal de jefaturas.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
50%	50%	100%

Se ha trabajado en la definición de 4 Indicadores claves de Desempeño (KPI por sus siglas en inglés) a nivel de jefaturas que serán incorporados al sistema a cada una de las jefaturas organizativas de la Institución.

Pr.5.2.2.e. Planificar y dar seguimiento a la gestión legal institucional. 100% (GLE).

El proyecto consiste en documentar los procedimientos que rigen el quehacer del área legal, así como la elaboración de informes de gestión para informar a las autoridades acerca de Procesos Administrativos tales como Sancionatorios de Multa e Inhabilitaciones, procesos de extensión de contratos y procesos judiciales, reclamos de garantías realizados por la Gerencia Legal.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
33%	33%	100%


Se presentó al CAD el Informe semestral de Procesos Sancionatorios, terminación de contratos por mutuo acuerdo, Revocaciones, etc.; y procesos judiciales.

RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.

(Porcentaje promedio de cumplimiento 85%)

El Resultado Estratégico 5.3, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 9 se presenta el porcentaje de cumplimiento del semestre correspondiente este:

Gráfico 9. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-septiembre 2020



PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía

Pr.5.3.1.a. Posicionar a la institución ante los públicos internos y externos. 85% (DCR)

El proyecto consiste en desarrollar acciones comunicacionales tendientes a divulgar el quehacer Institucional en pro del Desarrollo Local mediante diferentes medios (programas sociales, actividades de visualización y posicionamiento de la imagen Institucional, videos, etc.), y cuyos contenidos están dirigidos al personal institucional, socios para el desarrollo, población participante de los programas y población en general.

Descripción de avance:

Avance programado:	Avance ejecutado:	Porcentaje de cumplimiento:
47%	40%	85%

Actividades consideradas en el proyecto:

1. Desarrollo de eventos de carácter público, con materiales comunicacionales, y su difusión a través de diferentes medios (18 eventos):

- 16 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Quezaltepeque, La Libertad.

- 17 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Colón, La Libertad.
- 22 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Nueva Granada, Usulután.
- 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Alegría, Usulután.
- 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Berlín, Usulután.
- 24 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Mercedes Umaña, Usulután.
- 29 de enero 2020. Entrega equipamiento PES - CONVIVIR, Tecoluca, San Vicente.
- 31 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Sesorí, San Miguel.
- 4 febrero 2020. Inauguración Centro Escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente, La Unión.
- 5 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Guatajiagua, Morazán.
- 6 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Lislique, La Unión.
- 6 de febrero. Inauguración Parvularia 22 de abril, Soyapango, San Salvador.
- 13 febrero 2020. Ampliación proyecto PASO, San Miguel, San Miguel.
- 13 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, San Fernando, Morazán.
- 18 febrero. Entrega equipamiento PES -Retornados, Chirilagua, San Miguel.
- 17 de marzo. Reunión de la Sra. Presidenta del FISDL y el Ministro de la Defensa con alcaldes de zonas fronterizas de 8 departamentos: Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas, Morazán, San Miguel, La Unión y Cuscatlán.
- Capacitación Programa Emprendimiento Solidario
- Taller construcción de propuesta de mejora trabajo territorial

2. Visitas territoriales de la Alta Dirección con Socios para el Desarrollo y aliados estratégicos (2 visitas):

- 17 de febrero. Gira representante AACID a Armenia, Sonsonate para conocer avances del proyecto de Prevención de la Violencia.
- 21 de febrero 2020. Gira Embajador de España y representantes AECID a proyecto finalizado de agua potable y colocación de primera piedra de proyecto de saneamiento en Metalío, Acajutla, Sonsonate.

3. Producción de videos de las actividades territoriales (11 videos):

- “Hemos unido esfuerzos para que la niñez salvadoreña acceda a servicios de educación en bonitas, cómodas y seguras instalaciones.”
- “Durante 2019, mejoramos espacios públicos, brindando las condiciones adecuadas para que personas de todas las edades reconstruyan lazos de convivencia y solidaridad en las comunidades.”
- “Jóvenes del emprendimiento Kazu Organic, de Lourdes Colón, recibirán insumos productivos para potenciar su negocio. Escucha lo que tiene que decir Zuleima Maldonado, emprendedora.”
- “Nosotros podemos salir adelante sin necesidad de migrar a otro país, sin necesidad de buscar sueños en vano, si tenés tu sueño en tu país”. Paola Lara, Taller Los Ángeles- TAL, Lourdes Colón.
- “Instalaciones renovadas del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
- “Palabras de asistentes al evento de inauguración del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
- “Equipamiento productivo para emprendedores de San Fernando, Morazán.”
- “Migrantes retornados reciben apoyo para sus emprendimientos en Chirilagua.”
- “Adultos mayores son más vulnerables al contagio del coronavirus.”
- “Al quedarte en casa, proteges a toda la familia, en especial a quienes ya cuidaron de ti.”
- “Protejámonos del contagio del coronavirus.”

4. Elaboración de videos documentales de fechas conmemorativas y temas estratégicos:


- Video documental para la conmemoración del Día de la Mujer publicado el 08 de marzo 2020

5. Lanzamiento oficial y mantenimiento con contenido comunicacionales del Portal informativo Interno, debido a aspectos técnicos de compatibilidad, aún no se puede hacer público el portal de comunicación interna, ante esto, se creó un grupo institucional de WhatsApp para compartir información oficial al personal. Entre la información compartida esta: Campaña de vacunación, Sistema de marcación, Conformación Comisión de Ética del FISDL.

Para este periodo se tenían programadas el desarrollo de una actividad de la Alta Dirección Alta Dirección con Socios para el Desarrollo y aliados estratégicos, la producción de un video de actividades territoriales, pero a raíz de la pandemia todas estas actividades se han visto disminuidas, por lo que no se pudo ejecutar todo lo que estaba programado, lo cual representa el 15% de no cumplimiento del proyecto.

CAPÍTULO VI

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

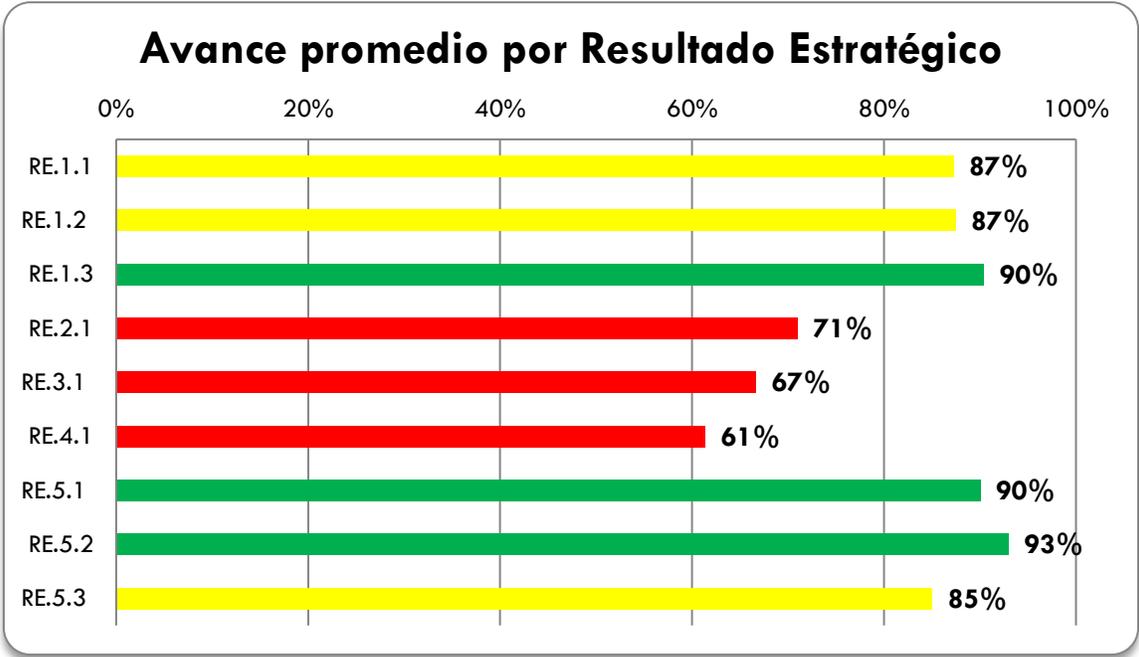

Se ha presentado la información de 30 proyectos que tenían programación de ejecución para los meses de enero a septiembre 2020, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 17 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento entre el 92% y el 100%.
- ✓ 5 proyecto con un grado de retraso, en un rango de avance entre 75% y el 89%.
- ✓ 8 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75%, con un rango de avance entre 50% y el 73%.

Para este periodo, el porcentaje de cumplimiento promedio de los proyectos POA de acuerdo con su ámbito de incidencia, es el siguiente:

- ✓ Generación de efectos en la población 81%
- ✓ Fortalecimiento Institucional 87%

ANEXO 1

DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A) Pr.1.1.1.b. Dotación de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural (GIN)

PROYECTOS EJECUTADOS:

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN			
Proyecto	Nombre	Acometidas Eléctricas	Población Beneficiaria
342650	Energía eléctrica en caserío San Luis Córdova, Panchimalco	39	180
349710	Introducción de energía eléctrica en colonia la amistad y caserío La Angostura del cantón Zacamil; colonia Las Margaritas, caserío El Zope, cantón Los Alpes y cantón El Carrizo, sector 1 y 2. Tepecoyo, La Libertad	209	8,102
349540	Ruta de proyectos eléctricos, San Cristóbal	34	204
347860	Electrificación en varios caseríos y varios cantones del municipio de Santa Catarina Masahuat	63	385
348270	Ampliación de energía eléctrica en caserío La Colmena, cantón El Jute	19	264
342270	Introducción de energía eléctrica en varios sectores del municipio	62	360
349750	Electrificación en caserío Tihuicha, cantón Tihuicha	126	632

CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN			
Proyecto	Nombre	Centros Escolares	Población Beneficiaria

357600	Ruta 11- Lempitas Ahuachapán - 15 Centros Escolares	15	3,000
341701	Mejoramiento y ampliación de Centro Escolar caserío El Manzanillo, cantón El Molino	1	37
349490	Rehabilitación y ampliación de Escuela de Educación Parvularia de Ciudad Barrios.	1	8,631
341590	Escuela Parvularia Jardín De Niños 22 de abril, Soyapango	1	191
349730	Remodelación del Centro Escolar Juan Manuel Rodríguez, cantón Guachipilín.	1	151
351730	Ruta 9- Lempitas Sonsonate - 10 Centros Escolares	10	2,000
357530	Mejoramiento de infraestructura de centro escolar en caserío El Portillo, cantón Hacienda.	1	28
348150	Ruta 6- Lempitas Sonsonate - 12 Centros Escolares	12	2,400
348260	Ruta 7 Lempitas Sonsonate - 12 Centros Escolares	10	2000
349740	Rehabilitación y ampliación del Centro Escolar Dr. Ricardo Trigueros De León, cantón Las Marías.	1	185

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
351830	Obras en cancha colonia Boquín, Mejicanos	1	33,181
341910	Centro integral de convivencia ciudadana Mauricio El Tuco Alfaro	1	383
351810	Área verde en parque La Cruz colonia Montebello, Mejicanos	1	2,305
346810	Construcción de cancha sintética de futbol once Col. Santa Elena, Llano El Espino	1	21,519

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
349550	Equipamiento municipalidad de Santiago Nonualco	1	1,200

PROYECTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO

Proyecto	Nombre	Sistema De Saneamiento	Población Beneficiaria
-----------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------

346721	Saneamiento caserío La Pita	22	110
351630	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos de los cantones Belén, Teponahuaste y San Cristobal, II Etapa	122	610

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
348020	Introducción de agua potable y saneamiento básico en caserío El Cucurucho, Los Filos, El Centro Y El Filón Del Cantón Palacios, municipio de Jutiapa	1	928
357050	Sistema de tratamiento para remover arsénico en zona sur, San Luis Talpa	1	3,408

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS, GIMNASIOS NACIONALES, ETC)

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
347850	Remodelación del Estadio Ana Mercedes Campos De Sonsonate	1	30,850

PROYECTOS PENDIENTES:

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
348250	Electrificación en caserío Santa Juana sector I y II cantón El Izote, caserío Las Crucitas, cantón El Ángel y caserío San Marcos cantón San Marcos (Teotepeque)	61	Acometida eléctrica
349680	Introducción de energía eléctrica en caserío El Refugio, cantón San Antonio, caseríos El Cacique y San Rafael Tronconales, del cantón Conacaste. (Comasagua)	65	Acometida eléctrica
357850	Introducción de energía eléctrica en caserío Los López, cantón Coquiama. (Cuisnahuat)	54	Acometida eléctrica

CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
351850	Mejoramiento de C.E. Caserío Puente Arce, cantón Jocotillo	1	Centro Escolares
348090	Ruta 4 Lempitas Ahuachapan-11 Centros Escolares	11	Centros Escolares

351740	Ruta 10- Lempitas Santa Ana - 14 Centros Escolares	14	Centros Escolares
357610	Ruta 12- Lempitas Santa Ana - 12 Centros Escolares	12	Centros Escolares

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL.

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
357800	Remodelación parque en colonia San Francisco, El Rosario	1	Proyecto
351820	Obras de mejoramiento parque Residencial Los Álamos, Mejicanos	1	Proyecto
351860	Construcción e iluminación de cancha sintética de fútbol once, colonia Santa Elena Llano El Espino, Ahuachapan.	1	Proyecto

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (GOBIERNOS LOCALES, U OTRA INFRAESTRUCTURA ESTATAL)

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
349580	Equipamiento municipalidad de Cojutepeque	1	Proyecto
349720	Necesidades de equipamiento en la alcaldía municipal de Ahuachapán	1	Proyecto

B) Pr.1.2.1.c. Dotación de Infraestructura vial y productiva (GIN)

PROYECTOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Proyecto	Nombre	Km	Población Beneficiaria
348010	Concreteado de tramos de calle entre cantón Vainillas y cantón Petapa	0.92	1,206
349690	Empedrado fraguado con superficie terminada en calle a colonia Yumanyi, cantón Las Flores, Jayaque, La Libertad	0.3	451
309660	Recarpeteo asfáltico y ampliación de la 8a calle poniente, 15 avenida norte y avenida Central del área urbana del municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.	0.16	20,400

348040	Asfaltado de puntos críticos en la calle hacia el cantón Valle de Jesús, San Fernando, Chalatenango	0.89	800
358040	Empedrado fraguado calle colonia Monte María, El Rosario	0.39	649

OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
333680	Construcción de obra hidráulica en calle principal del cantón Planes del Ranchador	1	180

PROYECTOS QUE FOMENTAN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad De Medida
291991	Reparación y adecuación Agencia de Extensión CENTA Zapotitán	1	Proyecto

C) Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura (GIN)

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE PROYECTOS DE AGUA

Código	Proyecto
265210	Introducción agua potable y saneamiento cantones Las Minas y otros, Apastepeque
342770	Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco
349590	Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria
342770	Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco

DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES POR MÓDULOS

Código	Proyecto	Modulo
	SC-Recuperación de zona verde en colonia Ciudad Pacífica	Organización y participación comunitaria
	SC-Recuperación de zona verde en colonia Milagro de la Paz	Organización y participación comunitaria

358160	Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca	Contabilidad y finanzas
	Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix, San Miguel	Contabilidad y finanzas
	S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello del municipio de Quezaltepeque	Ciclo del Proyecto
	S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque	Ciclo del Proyecto

DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS

Código	Proyecto
359690	Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2
	S/C CICC cantón Chancuyo Centro, Ahuachapán
	SC-Construcción de áreas de emprendimiento gastronómico en Complejo Charlaix, San Miguel
357870	Saneamiento en cantón Metalío I Etapa
346810	Construcción de cancha sintética de futbol once colonia Santa Elena, Llano El Espino
351860	Iluminación de cancha sintética de futbol once colonia Santa Elena, Llano El Espino

D) Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. (GIN)

EJECUTADO:

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Convenios

Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL. (Ejecución de 7 proyectos)

Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL.(ejecución de 1 proyecto en San Luis Talpa)

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenios

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya.

Convenio con la Municipalidad de Yamabal, Depto. de Morazán

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Soyapango, Obra Nueva en Colonia Sierra Morena

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DECENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenios

Convenio con la Municipalidad de Santiago Nonualco, proyecto 351910 Centro de Formación, colonia El Milagro

PENDIENTES DE EJECUCIÓN:

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS)

Convenios

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya.

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CICC Chancuyo Centro, I Etapa.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Convenios

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y SONSONATE SOLAR, S.A. DE C.V

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenio

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CCICC Chancuyo Centro, I Etapa.

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Convenio

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Metapan, el FISDL y VENTUS S.A. DE C.V.

ANEXO 2

DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

A) Pr.1.1.2.a. Entrega de Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad.

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	Cabañas	Cinquera	86	may-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Concepción Batres	723	may-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Guatajiagua	508	may-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Joateca	224	may-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	Paraíso De Osorio	126	may-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	San Antonio Masahuat	94	may-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	San Jorge	595	may-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	Santa María Ostuma	324	may-20
Pensión Adulto Mayor	Sonsonate	Santo Domingo	257	may-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Torola	128	may-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Alegría	629	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Berlín	629	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Sonsonate	Caluco	406	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Chilanga	465	jun-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	Ciudad Barrios	802	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Sonsonate	Cuisnahuat	477	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Cabañas	Dolores	211	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	El Rosario	60	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	Jerusalén	35	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	San Emigdio	140	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	San Fernando	116	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	San Juan Tepezontes	190	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	San Pedro Nonualco	205	jun-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	San Rafael Oriente	317	jun-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	Sesori	617	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	Tapalhuaca	64	jun-20
Pensión Adulto Mayor	La Libertad	Teotepeque	351	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Yamabal	205	jun-20
Pensión Adulto Mayor	Ahuachapán	Guaymango	764	jul-20

Pensión Adulto Mayor	Morazán	Perquín	36	jul-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	San Gerardo	396	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Cuscatlán	Suchitoto	438	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Ozatlan	684	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	San Agustín	262	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Santa Ana	El Porvenir	215	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Las Flores	46	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Osicala	188	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Potonico	117	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	San Antonio De La Cruz	36	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	San Antonio Los Ranchos	29	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	San Fernando	82	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	San Isidro Labrador	9	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Cancasque	95	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Arcatao	99	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Ahuachapán	San Lorenzo	257	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	El Carrizal	138	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Arambala	133	jul-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	Carolina	483	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Cabañas	Jutiapa	334	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Sensembra	127	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Lolotiquillo	248	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Nombre De Jesus	202	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Corinto	646	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Jocoaitique	81	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Santa Ana	Masahuat	150	jul-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	San Miguel Tepezontes	201	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Mercedes Umaña	651	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Gualococti	220	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Nueva Trinidad	75	jul-20
Pensión Adulto Mayor	La Paz	Tapalhuaca	64	jul-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	San Antonio	313	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Tecapan	482	jul-20
Pensión Adulto Mayor	San Vicente	Tecoluca	277	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	Estanzuelas	532	jul-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	Cacaopera	466	ago-20
Pensión Adulto Mayor	Usulután	San Francisco Javier	296	ago-20
Pensión Adulto Mayor	Sonsonate	Santa Isabel Ishuatan	455	ago-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	Lolotique	352	ago-20
Pensión Adulto Mayor	San Vicente	San Ildelfonso	377	ago-20
Pensión Adulto Mayor	La Libertad	Comasagua	490	ago-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	La Laguna	191	ago-20
Pensión Adulto Mayor	La Unión	Lislique	541	ago-20
Pensión Adulto Mayor	Chalatenango	Agua Caliente	315	sep-20
Pensión Adulto Mayor	San Vicente	Apastepeque	658	sep-20

Pensión Adulto Mayor	Cuscatlán	El Carmen	332	sep-20
Pensión Adulto Mayor	Ahuachapán	Jujutla	1,165	sep-20
Pensión Adulto Mayor	San Miguel	Nuevo Eden De San Juan	192	sep-20
Pensión Adulto Mayor	Morazán	San Isidro	153	sep-20
Pensión Adulto Mayor	Santa Ana	Santiago De La Frontera	283	sep-20
Pensión Adulto Mayor	Ahuachapán	Tacuba	949	sep-20
Pensión Adulto Mayor	Cabañas	Victoria	603	sep-20
Pensión Adulto Mayor	La Unión	Yayantique	191	sep-20
Pensión Adulto Mayor	La Unión	Yucuaiquin	188	sep-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Guatajiagua	45	may-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Torola	128	may-20
Pensión Discapacidad	Sonsonate	Caluco	59	jun-20
Pensión Discapacidad	Sonsonate	Cuisnahuat	33	jun-20
Pensión Discapacidad	Morazán	San Fernando	16	jun-20
Pensión Discapacidad	La Libertad	Teotepeque	34	jun-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Yamabal	22	jun-20
Pensión Discapacidad	Chalatenango	San Antonio De La Cruz	3	jul-20
Pensión Discapacidad	Chalatenango	San Fernando	2	jul-20
Pensión Discapacidad	Chalatenango	Cancasque	11	jul-20
Pensión Discapacidad	Cabañas	Jutiapa	43	jul-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Gualococti	22	jul-20
Pensión Discapacidad	San Miguel	San Antonio	68	jul-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Cacaopera	37	ago-20
Pensión Discapacidad	Usulután	San Francisco Javier	18	ago-20
Pensión Discapacidad	Sonsonate	Santa Isabel Ishuatan	34	ago-20
Pensión Discapacidad	La Unión	Lislique	139	ago-20
Pensión Discapacidad	Morazán	Joateca	20	sep-20
Pensión Discapacidad	San Miguel	Nuevo Edén De San Juan	28	sep-20
Pensión Discapacidad	Morazán	San Isidro	21	sep-20
Veteranos del Histórico FMLN	Varios	Varios	1,115	jun-20
